

IICA
E14
275

IICA




COOPERACION TECNICA FITOSANITARIA
EN APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIO
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS
DE MEXICO

Noviembre, 1990.

IICA OFICINA EN MEXICO

14
110A
H01
159





**COOPERACION TECNICA FITOSANITARIA
EN APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIO
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS
DE MEXICO**

Noviembre, 1990.

00004450

TITULO DEL PROYECTO:

COOPERACION TECNICA FITOSANITARIA EN APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE MEXICO.

PARTE A: PRESENTACION Y JUSTIFICACION.

1. IDENTIFICACION.


- 1.1 PROGRAMA: V SANIDAD AGROPECUARIA.
CODIGO:
- 1.2 AREA TEMATICA DE CONCENTRACION EN LA QUE SE UBICA EL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES DE SANIDAD VEGETAL Y APOYO AL COMERCIO INTERNACIONAL.
- 1.3 AMBITO GEOGRAFICO: REPUBLICA MEXICANA.
SEDE: MEXICO, D. F.
- 1.4 TIPO DE PROYECTO: NACIONAL.
- 1.5 FECHA DE:
INICIO: ENERO DE 1991.
TERMINO: DIC. DE 1994.
DURACION: CUATRO AÑOS
- 1.6 VERSION DEL DOCUMENTO: REFORMULADA
- 1.7 FINANCIAMIENTO DE:
- RECURSOS REGULARES : CUOTAS: X CATI's * :
- RECURSOS EXTERNOS: OTROS:
- 1.8 FECHA DE PREPARACION: NOVIEMBRE 1990.
- RESPONSABLE: ALFONSO GARCIA ESCOBAR.

1.9 APROBACION** :

MEMORANDO _____ DE FECHA _____ CODIGO _____

* PROVENIENTES DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO APROBADOS EN NOVIEMBRE DE 1990 Y DICIEMBRE de 1990 CON IICA-SANIDAD VEGETAL

** INFORMACION A CARGO DE LA UNIDAD DE TRAMITE DE INSTRUMENTOS DE COOPERACION TECNICA DE LA DIPROE.

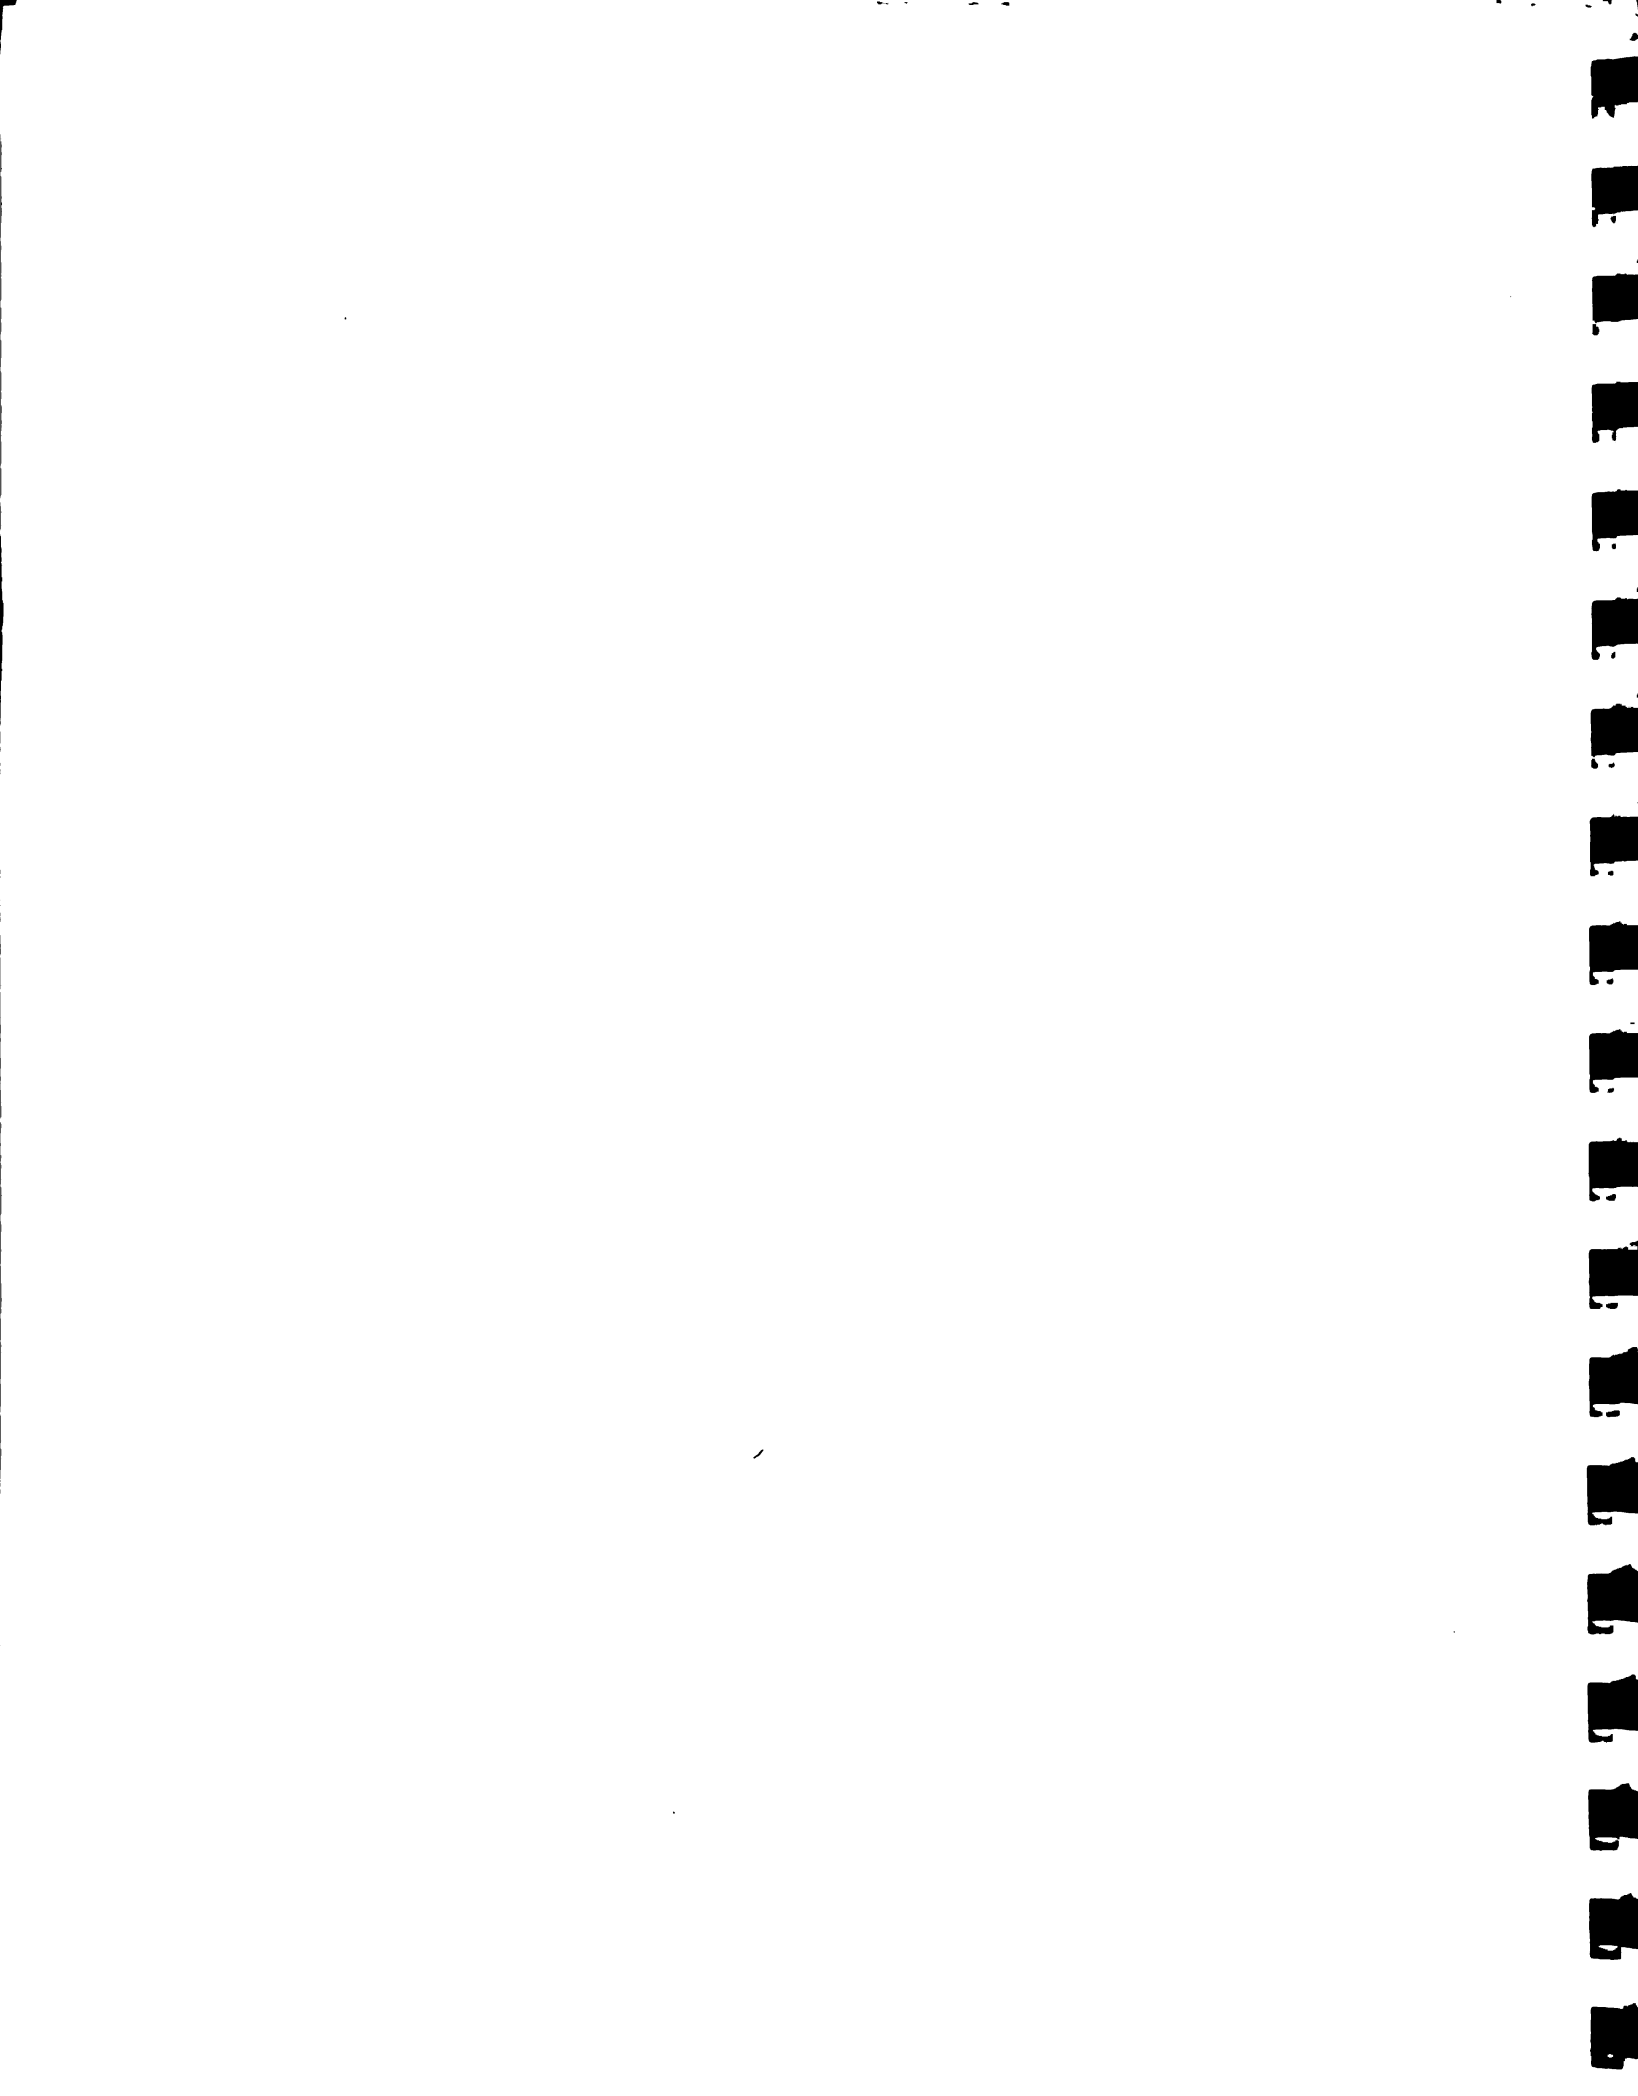

2. ANTECEDENTES.

COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 1989, POR EL PROYECTO NACIONAL DEL IICA EN MEXICO "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SARH/MEXICO EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL", EL IICA Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS CONVINIERON EN FIRMAR UN "MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACION FITOSANITARIA", CON BASE EN EL CUAL, LAS PARTES PODRAN DESARROLLAR PROYECTOS ESPECIFICOS DE COOPERACION TECNICA EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL.

EL AREA ESPECIFICA DE COOPERACION SEÑALADA EN EL MEMORANDO, ES EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL, DIRIGIDO A MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS, MEDIANTE LA CAPACITACION Y EL OPTIMO APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LOS CENTROS, Y EL APOYO AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS PRIORITARIAS FITOSANITARIAS EN EL PAIS, PARA FORTALECER LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES EN AREAS RELACIONADAS CON EL PROCESO AGROINDUSTRIAL Y LA EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

ESTE PROYECTO ES UNA VERSION REFORMULADA DEL PROYECTO NACIONAL "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA SARH/MEXICO EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL". EL PROYECTO ORIGINAL HA SIDO MODIFICADO Y ADAPTADO A LAS CONDICIONES CONVENIDAS POR LA SARH Y EL IICA EN EL CITADO MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO. SU ELABORACION SE REALIZO CONJUNTAMENTE CON TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, PROCESO MISMO QUE SE CONSTITUYO EN UNA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE "APRENDER HACIENDO", CON LAS VENTAJAS RESULTANTES DE LA ELABORACION CONJUNTA DEL DOCUMENTO-PROYECTO.

SIMULTANEAMENTE Y CON LA PARTICIPACION DE TECNICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL FUERON ELABORADOS SEIS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO, LOS CUALES SIRVEN DE BASE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRIMERAS ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA INDICADAS EN EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO LAS CUALES SON EL MARCO DE REFERENCIA DE ESTE PROYECTO NACIONAL IICA. LOS SEIS PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL SON:

- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO.
- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES DE CONTROL BIOLÓGICO.
- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE CONTROL DE PLAGUICIDAS.
- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES DE ESTUDIOS Y CONTROL DE ROEDORES ,AVES Y MOLUSCOS.



- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CAMPANA NACIONAL CONTRA EL AMARILLAMIENTO LETAL DE COCOTERO.
- EN PROCESO DE FORMULACION SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUARENTENA EN APOYO AL COMERCIO (IMPORTACION-EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS).

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SI BIEN EL PROYECTO ES RESULTADO DE AMPLIAS GESTIONES DEL IICA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, EXISTEN OTROS FACTORES QUE MOTIVARON LA FIRMA DEL MEMORANDO, COMO SON: LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS QUE EL IICA HA TENIDO CON EL PROYECTO NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DIGNOSTICO DE SALUD ANIMAL, Y LA NECESIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE FORTALECER SUS SERVICIOS FITOSANITARIOS, PARA SER CONGRUENTE CON LAS POLITICAS NACIONALES DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, MODERNIZACION DEL SECTOR, Y MAYOR PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO AL INCREMENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD, Y APOYO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

EN ADICION A LOS RECURSOS QUE LA SARH/DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL APORTARA AL PROYECTO, DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO SE PREVEE LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES, PRIMORDIALMENTE PROVENIENTES DEL SECTOR PRIVADO, DE PRODUCTORES AGRICOLAS, AGROIMPORTADORES-EXPORTADORES E INDUSTRIA DE AGROQUIMICOS, CON LA TENDENCIA INTERMEDIA DE LOGRAR EL AUTOFINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS, Y CON EL OBJETIVO FINAL DE LA PRIVATIZACION DE AQUELLOS QUE RESULTEN CONVENIENTES.

3. PROBLEMA ESPECIFICO QUE EL PROYECTO BUSCA RESOLVER.

EN MEXICO LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS, TIENE COMO RESPONSABILIDAD BASICA, PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR, OPERAR, Y NORMATIVAR LOS SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL MEDIANTE LA EJECUCION DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A PREVENIR, CONTROLAR Y/O ERRADICAR LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS CULTIVOS EN EL PAIS.

CON BASE EN LA LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL, LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL A NIVEL GENERAL DESARROLLA ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO, CONTROL BIOLÓGICO, CONTROL DE PLAGUICIDAS, CONTROL DE ROEDORES AVES, MALEZAS Y MOLUSCOS, Y A NIVEL ESPECIFICO TIENE ESTABLECIDAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS PARA DAR ATENCION A PROBLEMAS FITOSANITARIOS PRIORITARIOS COMO : LANGOSTA, AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO, MOSCAS DE LA FRUTA, AFLATOXINAS, CARBON PARCIAL DEL TRIGO, SOYA LINEAL DE LA CEBADA, ROYA Y BROCA



DEL CAFETO, TODO ELLO COMO APOYO A LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.


EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE ESTA RESPONSABILIDAD LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, TIENE ESTABLECIDA UNA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS, LA CUAL CONSTITUYE LA BASE PRINCIPAL DE APOYO TECNICO-OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION, DIAGNOSTICO, CONTROL Y/O ERRADICACION DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS QUE AFECTAN Y AMENAZAN LA AGRICULTURA NACIONAL Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE SUS PRODUCTOS AGRICOLAS.

LA RED ESTA INTEGRADA POR 70 CENTROS REGIONALES DISTRIBUIDOS EN LOS 32 ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA, LOS CUALES EN SU MAYORIA FUERON ESTABLECIDOS EN EL PERIODO DE LOS SETENTAS Y SU UBICACION CORRESPONDE A LAS ENTIDADES INDICADAS EN EL CUADRO No. 1:

LOS CENTROS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO TIENEN CARACTER DE CENTROS NACIONALES DE COORDINACION Y REFERENCIA EN APOYO A LOS CENTROS REGIONALES, Y CUMPLEN CON LA FUNCION DE UNIDAD TECNICA ANALITICA DE VERIFICACION EN APOYO AL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. ADICIONALMENTE PRESTAN SERVICIO A NIVEL DEL AREA DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MEXICO. LOS CENTROS REGIONALES FUNDAMENTALMENTE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE CARACTER OPERATIVO Y ALGUNOS DE ELLOS ESTAN EN LA ETAPA DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS.

LA NECESIDAD Y COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE LAS POLITICAS NACIONALES DE DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Y DE REDUCCION Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO, HA INCIDIDO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CENTROS Y LAS CAMPANAS FITOSANITARIAS PRESENTANDOSE UN DEBILITAMIENTO OBSERVABLE A TRAVES DEL:

- DETERIORO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO.
- REDUCIDA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y REACTIVOS.
- DISMINUCION DE LA CAPACIDAD TECNICA DE MUESTREO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO
- DESACTUALIZACION TECNICA.
- LIMITACIONES PARA EL INCREMENTO SALARIAL.
- DESMOTIVACION Y BAJA DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL
- INCREMENTO DE LA INESTABILIDAD DEL MISMO.
- DISMINUCION DEL NUMERO DE PERSONAL.
- LIMITACIONES PARA SU REEMPLAZO.
- REEMPLAZOS POR PERSONAL NO CALIFICADO.

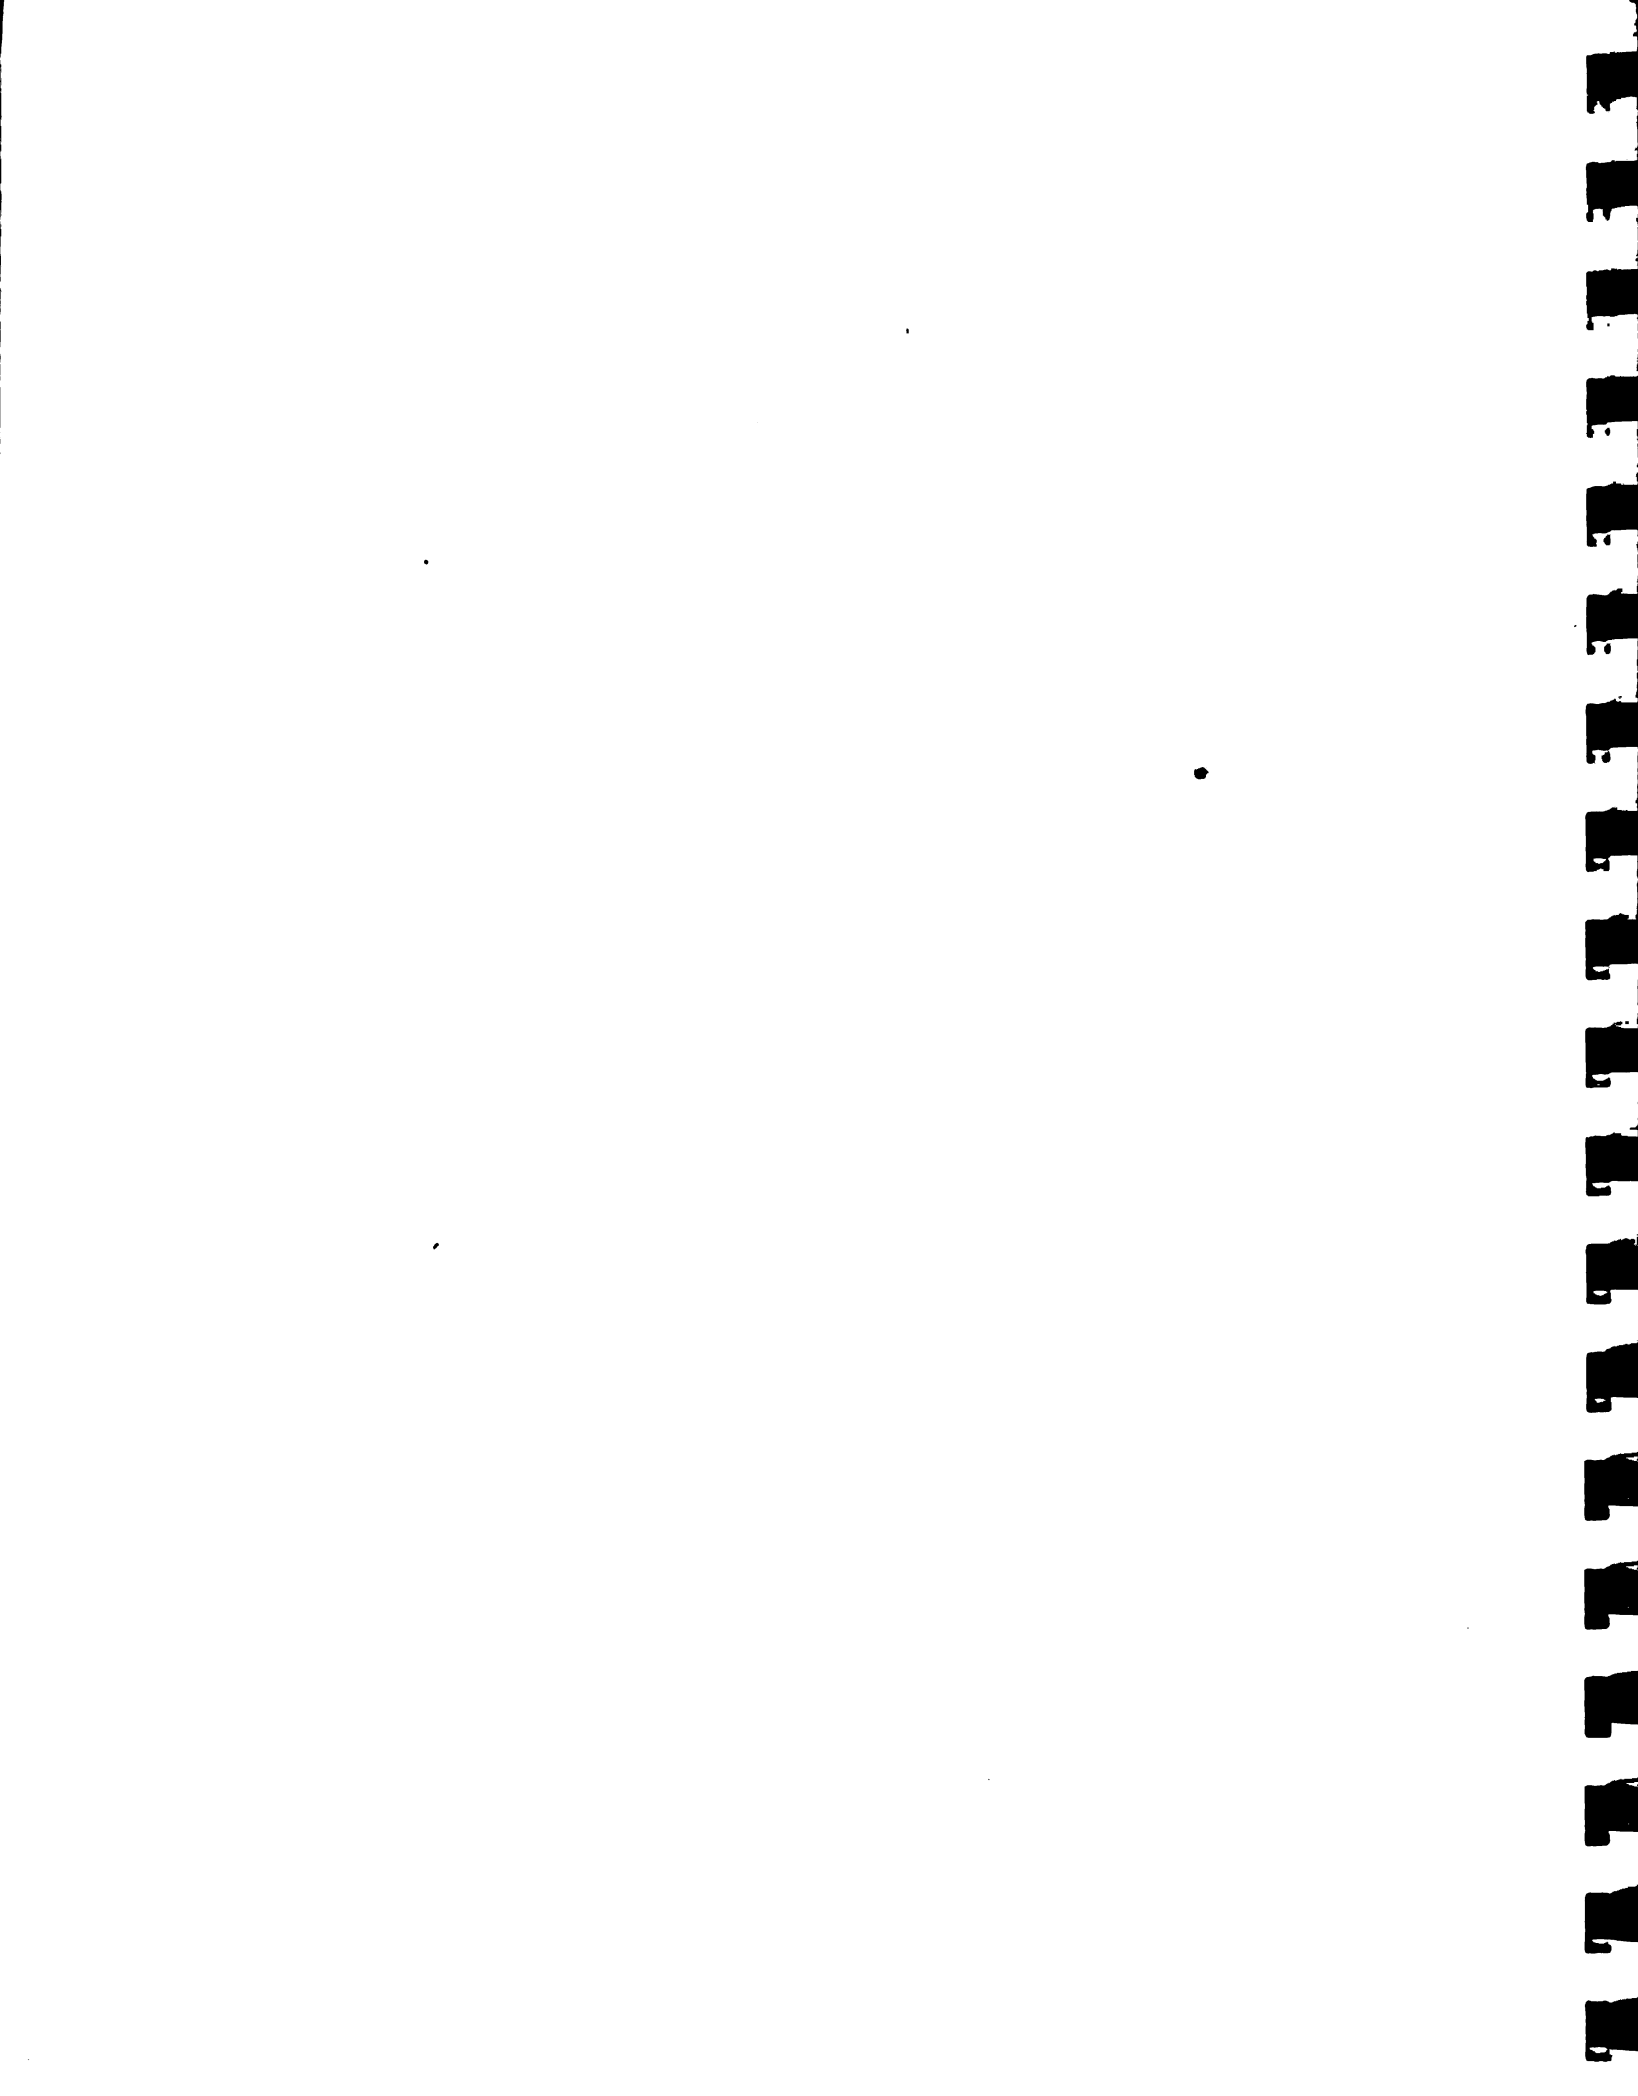

COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS MANIFIESTAN:

- LIMITADA CAPACIDAD PARA LA EVALUACION DE LOS IMPACTOS DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS.
- LA REDUCCION DE LAS VISITAS DE INSPECCION.
- LA DISMINUCION DE MUESTRAS COLECTADAS Y ANALIZADAS.
- NIVEL DE CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS Y DIGANOSTICOS.
- LIMITADA CAPACIDAD PARA ANALIZAR NUEVOS PROBLEMAS.
- DESACTUALIZACION EN LOS MECANISMOS DE EVALUACION DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y LAS CAMPANAS.
- PERDIDA DE IMAGEN DE LOS CENTROS, DE LAS CAMPANAS Y DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL.

DEBIDO A ESTA SITUACION, LOS CENTROS Y LAS CAMPANAS FITOSANITARIAS ENFRENTAN LIMITANTES QUE LES IMPIDEN CUMPLIR DE MANERA ADECUADA, LAS FUNCIONES TECNICAS Y OPERATIVAS PARA LAS CUALES FUERON CREADOS; Y POR CONSIGUIENTE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION, DIAGNOSTICO, CONTROL Y/O ERRADICACION DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS NO SON REALIZADAS DE LA MANERA DESEADA.


EN CASO DE NO SER ATENDIDA ESTA PROBLEMÁTICA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, SE PROVOCARA UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS, CON EFECTOS NEGATIVOS EN LA PRODUCCION Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS MEXICANOS.

COMO ESTRATEGIA OPERATIVA PARA PARA LA BUSQUEDA Y OBTENCION DE ALTERNATIVAS QUE PERMITAN ENCONTRAR UNA SOLUCION, MEXICO ESTA RECURRIENDO AL APOYO DE ORGANISMOS DE COOPERACION TECNICA FITOSANITARIA INTERNACIONAL, COMO LO ES EL CASO DEL IICA, EL CUAL A TRAVES DEL PROGRAMA V, CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE ESTE TIPO DE PROBLEMÁTICA.



CUADRO 1 - CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS DE MEXICO.

ENTIDAD	TIPO DE CENTRO REGIONAL FITOSANITARIO			
	DIGNOSTICO	CONTROL BIOLÓGICO	PLAGUICIDAS	ROEDORES Y MOLUSCOS AVES
1. AGUASCALIENTES	1			
2. BAJA CALIFORNIA	1	1	1	
3. BAJA CALIFORNIA SUR	1	1	1	
4. CAMPECHE				
5. COAHUILA	1	1		
6. COLIMA	1	1		1
7. CHIAPAS	1	1	1	
8. CHIHUAHUA	1	1	1	
9. DURANGO	1	1	1	
10. GUANAJUATO	1	1	1	1
11. GUERRERO				
12. HIDALGO	1			
13. JALISCO	1	1	1	
14. MEXICO	1		1	1
15. MICHOACAN	1	1	1	1
16. MORELOS	1	1		1
17. NAYARIT	1	1		
18. NUEVO LEON	1			
19. OAXACA	1	1		
20. PUEBLA	1			
21. QUERETARO	1			
22. QUINTANA ROO				
23. SAN LUIS POTOSI		1		
24. SINALOA	1	2	1	1
25. SONORA		4		
26. TABASCO				
27. TAMAULIPAS	2	2	1	
28. TLAXCALA	1	1		1
29. VERACRUZ	1	1		
30. YUCATAN	1	1		
31. ZACATECAS				
32. DISTRITO FEDERAL	2	1	1	
TOTAL = 70	26	25	12	7

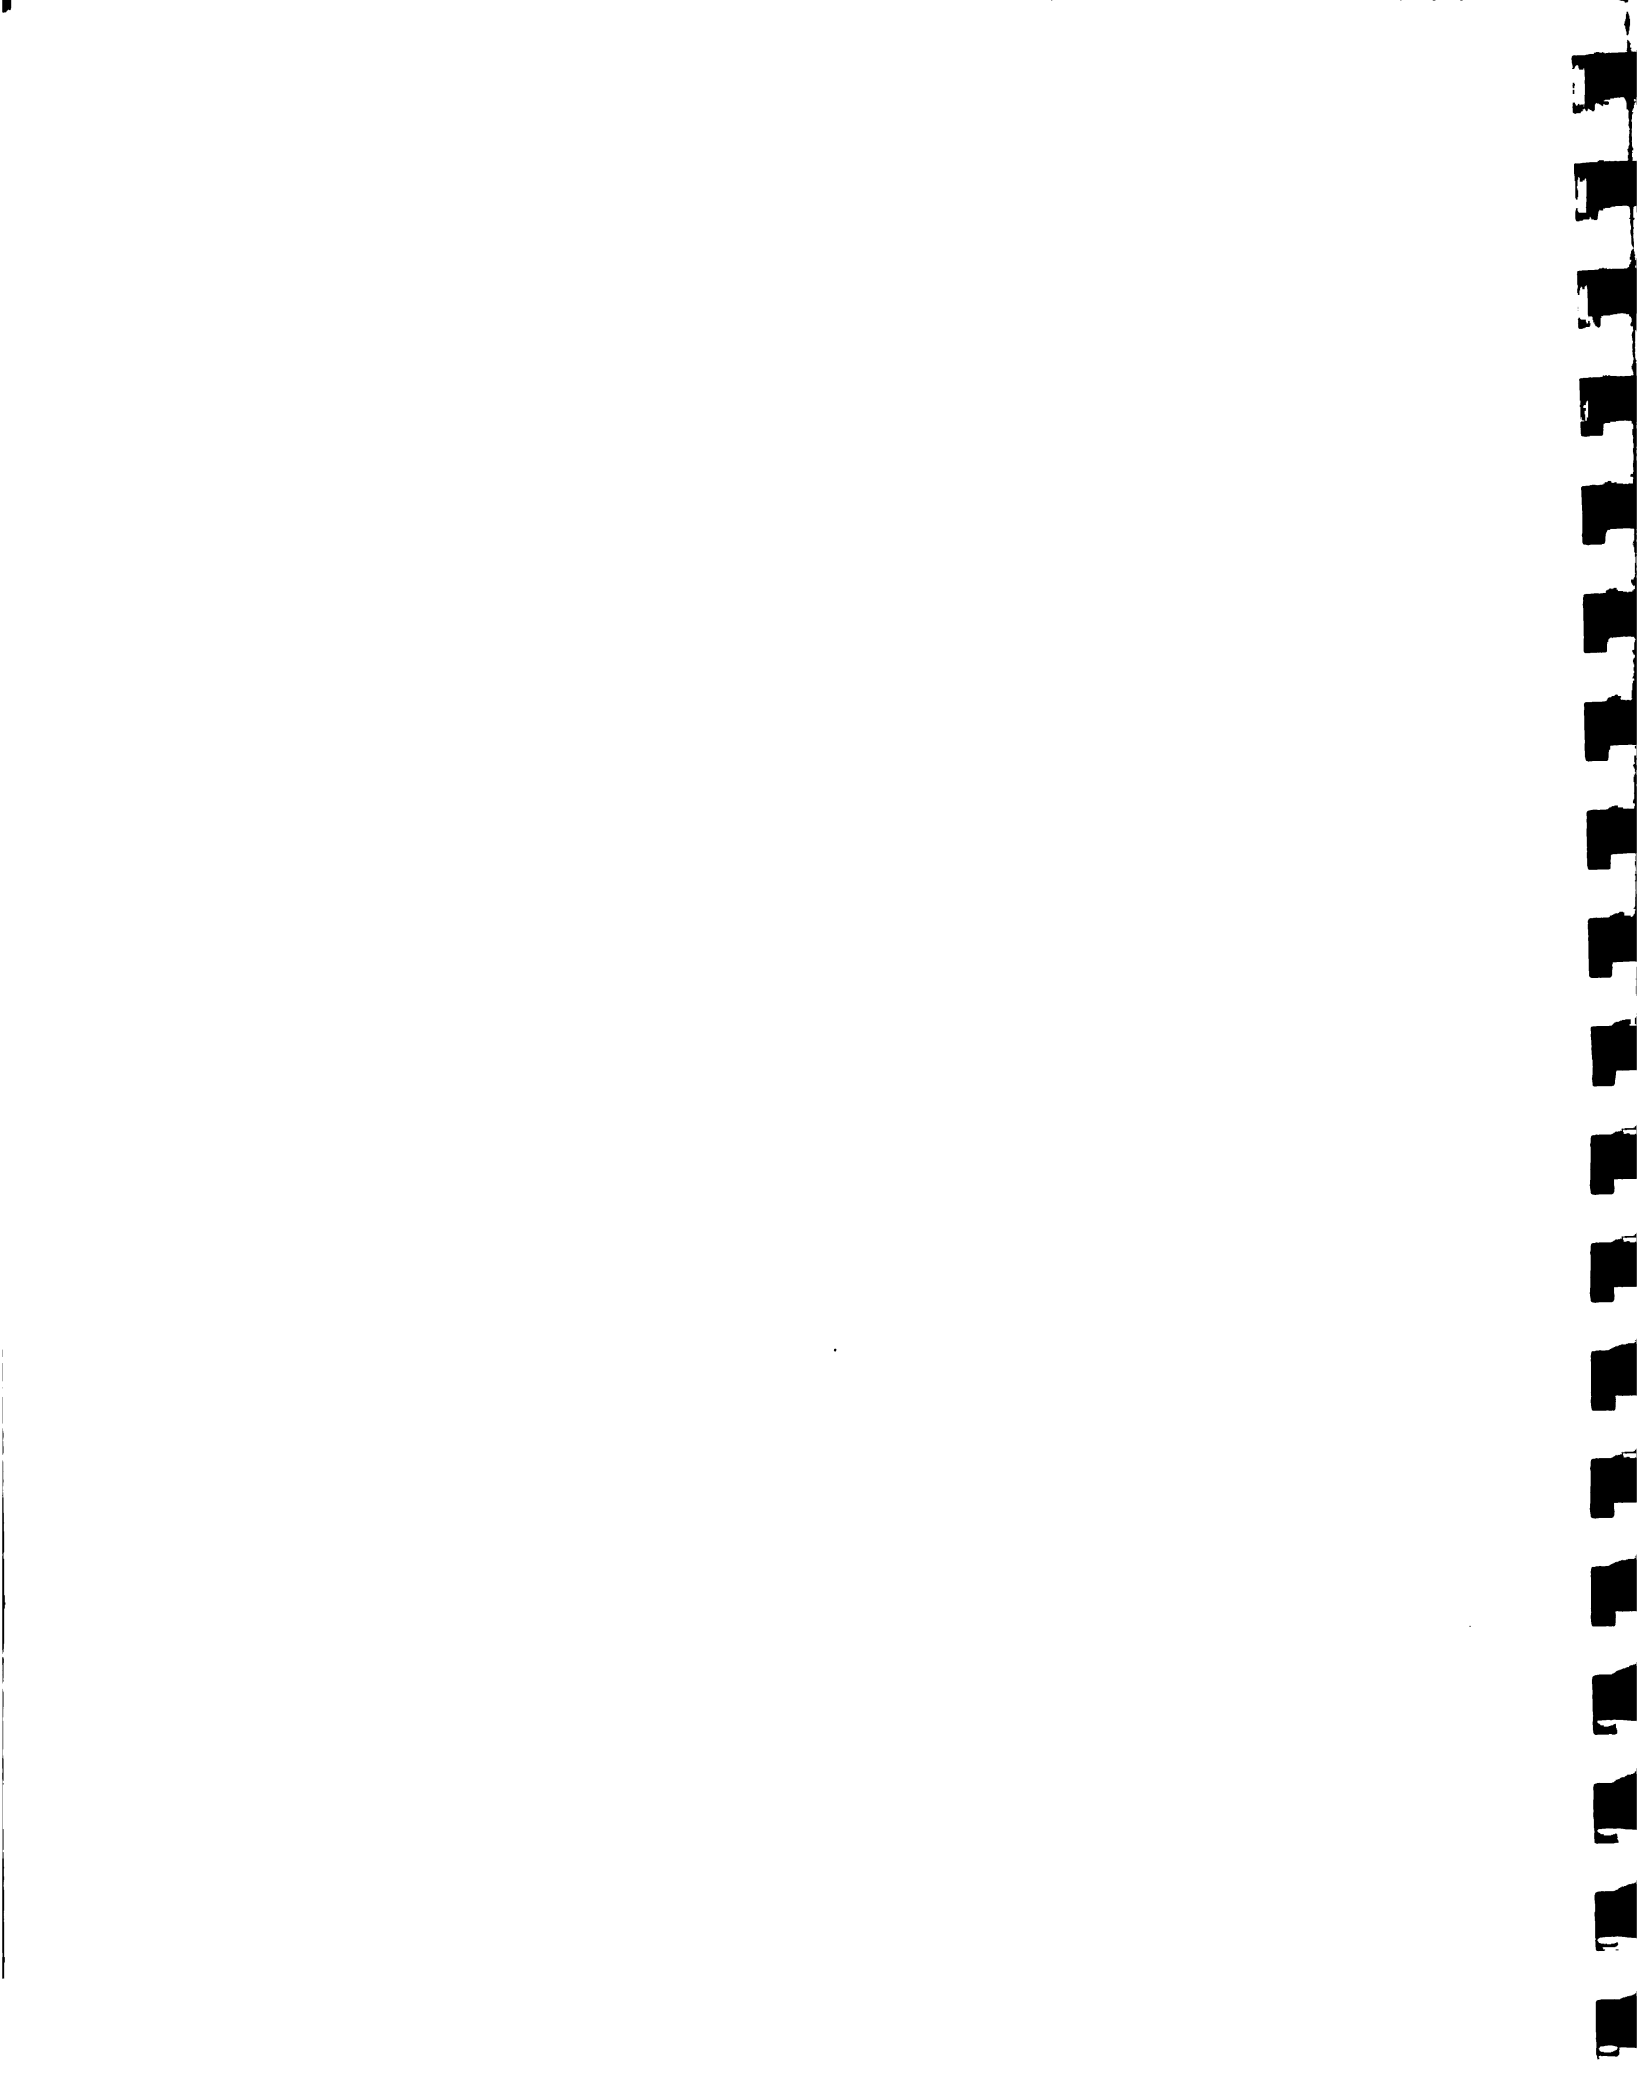

4. PROBLEMA GENERAL QUE ENMARCA EL PROBLEMA ESPECIFICO.


A FIN DE ESTABLECER UN MARCO CONCEPTUAL MAS OBJETIVO SOBRE LA PROBLEMATICA GENERAL PREVALECIENTE EN EL SECTOR AGRICOLA, SE HA OPTADO POR EXPONER EN ESTE CAPITULO UN BREVE RELATORIO HISTORICO DE LOS ULTIMOS 20 AÑOS, SEÑALANDOSE ASPECTOS PUNTUALES QUE MARCAN EN EL PAIS ETAFAS DE DESARROLLO DE ACCIONES DE RELEVANCIA, TENDIENTES A PROPICIAR CAMBIOS SUSTANCIALES EN EL DESARROLLO AGRICOLA DEL PAIS.

MEXICO AL IGUAL QUE LA MAYORIA DE LOS PAISES EN DESARROLLO DURANTE LOS ULTIMOS CINCUENTA AÑOS HA DESARROLLADO AMPLIAMENTE UNA POLITICA DE PRIORIDAD DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL, PROVOCANDO CON ELLO UN FUERTE REZAGO DEL SECTOR AGROPECUARIO. LA INGERENCIA DIRECTA DEL GOBIERNO AL DESARROLLO INDUSTRIAL, LLEGO A TAL GRADO QUE A FINALES DE LOS SETENTA, EXISTIAN EN MEXICO 970 EMPRESAS PARAESTATALES (AGRICOLAS, GANADERAS, MINERAS, TURISTICAS, DE SERVICIOS BASICOS, ETC.).

EN EL AMBITO AGRICOLA ANTE LA URGENCIA DE REVERTIR EL PROCESO EN EL AGRO, Y COMO RESULTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FEDERALES DERIVADOS FUNDAMENTALMENTE DEL PETROLEO, EL GOBIERNO FOMENTO EL CRECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, EN TODOS LOS NIVELES, TANTO A NIVEL CENTRAL COMO FORANEO. EN EL CASO PARTICULAR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A MEDIADOS DE LOS SETENTA, LA SECRETARIA CONTABA CON APROXIMADAMENTE VEINTE MIL EMPLEADOS DE LOS CUALES CERCA DE OCHO MIL, LABORANDO EN EL AREA DE SANIDAD VEGETAL.

COMO ACCIONES DE APOYO DIRECTO EL GOBIERNO ESTABLECE DIVERSOS PROGRAMAS DE ACCION BASADOS EN UNA SERIE DE ESTIMULOS A LA PRODUCCION A TRAVES DE SUBSIDIOS DE INDOLE DIVERSA. CASO PARTICULAR DE GRAN RELEVANCIA, LO CONSTITUYO EL SAM (SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO).

PARA FINALES DE LOS SETENTA, AMBOS SECTORES, EL INDUSTRIAL Y EL AGRICOLA SUFRIERON FUERTES IMPACTOS. EL SECTOR INDUSTRIAL TRADICIONALMENTE SOBREPOTEGIDO POR EL GOBIERNO, SE ENCUENTRA ANTE LA FALTA DE CAPACIDAD COMPETITIVA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION. EL SECTOR AGRICOLA NO OBSTANTE LOS RECURSOS CANALIZADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, NO LOGRA SUS OBJETIVOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y AL CONTRARIO SE HACE MANIFIESTO UNA TENDENCIA AL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES. AMBOS SECTORES DEBIDO A LA CAIDA DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO Y A LIMITACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PARA GOBERNAR Y AL MISMO TIEMPO ADMINISTRAR LAS EMPRESAS PARAESTATALES Y OTORGAR LA ASISTENCIA TECNICA REQUERIDA.

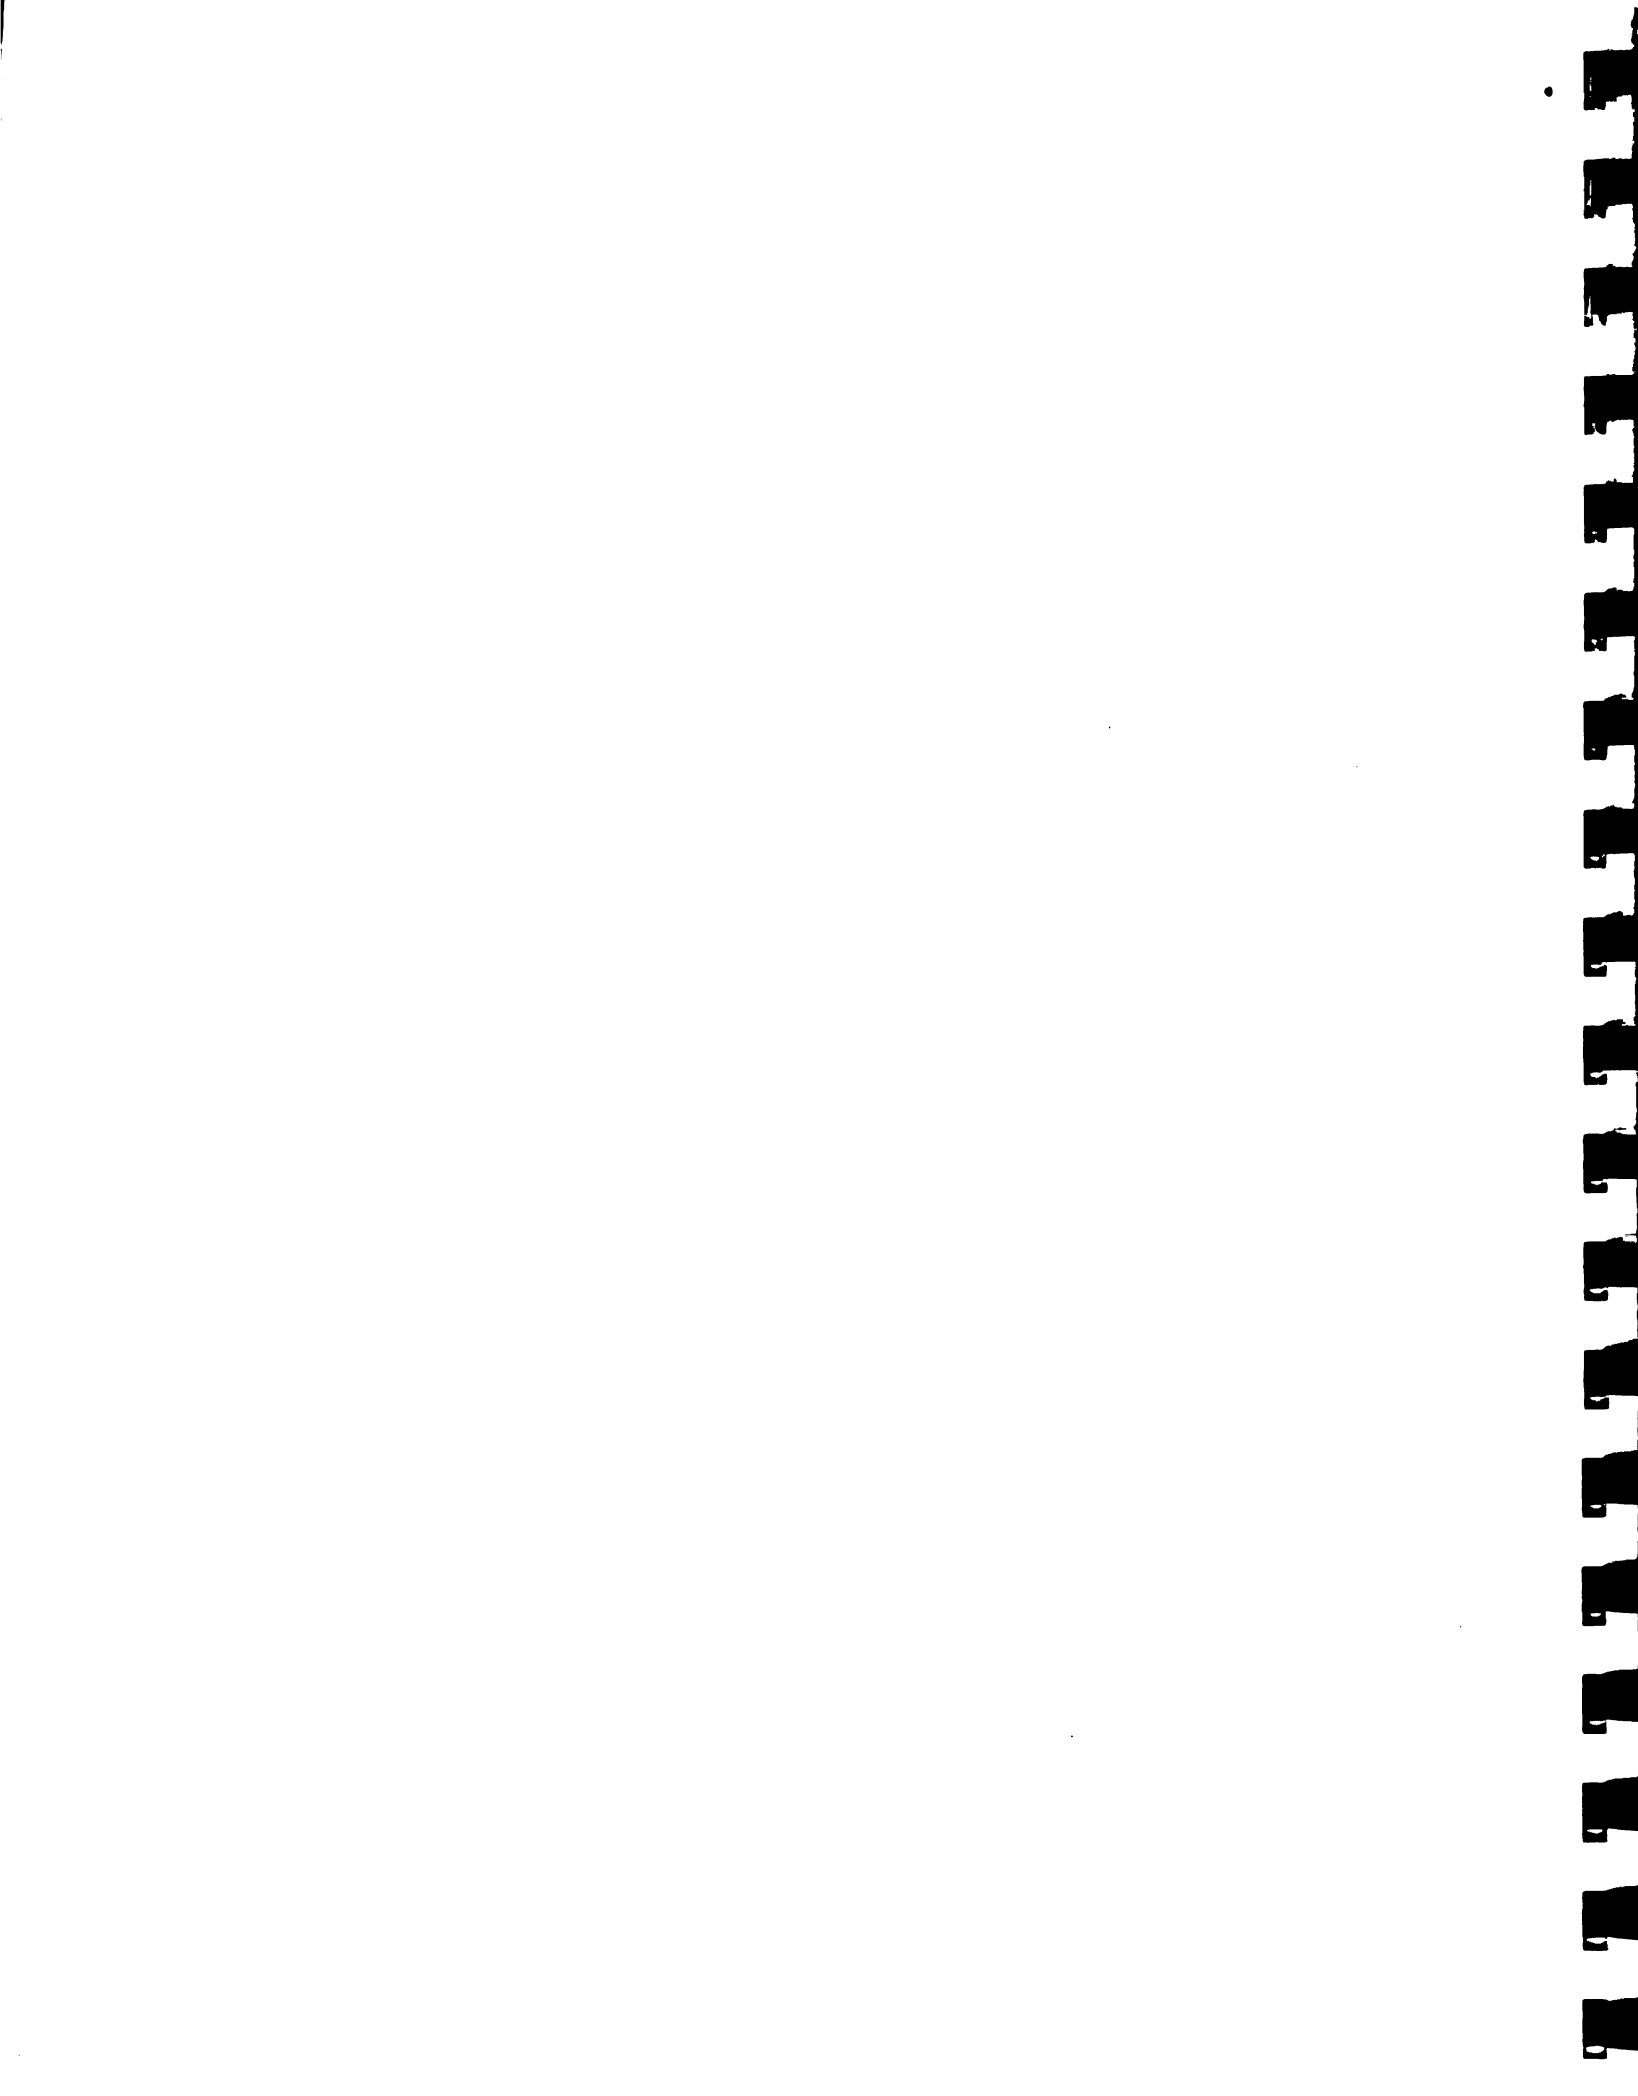

A PARTIR DE LOS OCHENTA LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DE MEXICO, ANTE LA MAGNITUD DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS FUERTES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO, INICIA ACCIONES DECISIVAS TENDIENTES A LA RACIONALIZACION, REDUCCION Y VIGILANCIA DEL GASTO PUBLICO, A TAL GRADO QUE SE CREA LA SECRETARIA DE ESTADO DE CONTRALORIA. EN EL AMBITO INDUSTRIAL SE INICIA UN PROCESO, QUE AUN CONTINUA, DE CIERRE, DESINCORPORACION Y PRIVATIZACION DE PARAESTATALES. EN EL SECTOR AGRICOLA SE TIENDE A DIMINUIR SUSTANCIALMENTE LA CARGA BUROCRATICA CENTRAL, SE PROPICIA LA DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION Y SE DA INICIO A UN PROCESO DE REESTRUCTURACION CENTRAL Y FORANEA, MISMO QUE TAMBIEN CONTINUA A LA FECHA.

A FINALES DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION EN 1987, CERCA DE 800 PARAESTATALES, HABIAN SIDO CERRADAS Y/O DESINCORPORADAS. EN EL SECTOR AGRICOLA, EL SERVICIO DE EXTENSION COMO TAL, PRACTICAMENTE DEJA DE EXISTIR. SE ESTABLECEN Y ENSAYAN DIVERSOS MODELOS DE ASISTENCIA TECNICA, Y EN EL CASO PARTICULAR DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA FITOSANITARIA, ESTE QUEDA REDUCIDO A SOLAMENTE 3,000 EMPLEADOS.

LA PRESENTE ADMINISTRACION 1988-1993, CONCIENTE DE LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON ESTOS PROCESOS DE REDUCCION DEL GASTO PUBLICO, Y DE DESINCORPORACION DE PARAESTATALES, BUSCA PRIORITARIAMENTE REORIENTAR SUS ESFUERZOS LIMITANDO Y TRASPASANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS, A OTROS SECTORES. ESTO HA PROPICIADO EL FUERTE DESARROLLO DE LAS POLITICAS DE REDUCCION DEL GASTO PUBLICO Y RETIRO VOLUNTARIO EN EL SECTOR PUBLICO, Y DE MAYOR PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES COMO SECTOR PRIVADO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CON UNA CLARA TENDENCIA A LOGRAR LA PRIVATIZACION DE TODOS LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS POSIBLES Y RECOMENDABLES.

ESTE CAMBIO DEL ROL PROTAGONICO DEL GOBIERNO REQUIERE DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE PROCESOS QUE PERMITAN AL PAIS LOGRAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE TRASPASAR UNA SERIE DE FUNCIONES AL SECTOR PRIVADO. LAMENTABLEMENTE EL PAIS AUNQUE CUENTA CON EXPERIENCIA QUE HA VENIDO DESARROLLANDO EN LOS ULTIMOS AÑOS, EN LA ACTUALIDAD NO SE ESTA LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADO PARA PODER ENTRAR EN EL PROCESO DE LA PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS Y AL MISMO TIEMPO RESPONDER CON EFICIENCIA A LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS FITOSANITARIOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.



5. TECNICAS Y METODOS DISPONIBLES PARA RESOLVER EL PROBLEMA ESPECIFICO.

DURANTE LOS AÑOS DE ACCION EN EL CAMPO DE LA COOPERACION TECNICA FITOSANITARIA INTERNACIONAL, EL IICA HA DESARROLLADO UNA CAPACIDAD PROPIA, A TRAVES DE SUS ESPECIALISTAS EXPERTOS EN DIVERSAS AREAS DE SANIDAD VEGETAL, QUE ES APOYADA Y SUSTENTADA POR LA AMPLIA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SUS OFICINAS EN LOS PAISES Y DE LA SEDE CENTRAL EN SAN JOSE, COSTA RICA.

EL PROGRAMA V DE SANIDAD AGROPECUARIA, HA DESARROLLADO AMPLIA EXPERIENCIA EN DIVERSAS PARTES DEL HEMISFERIO EN LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA FITOSANITARIA DE LOS PAISES, EN LA ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SANIDAD VEGETAL EN LOS PAISES, Y EN EL DESARROLLO DE ACCIONES NACIONALES Y REGIONALES CONTRA PROBLEMAS DE IMPORTANCIA FITOSANITARIA PRIORITARIA COMO: MOSCAS DE LA FRUTA, PICUDO DEL ALGODONERO, CANCRO CITRICO, SIGATOCA NEGRA DEL PLATANO, AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO Y AVES PLAGA, ENTRE OTROS.

CABE DESTACAR, ASIMISMO, LA EXPERIENCIA QUE TIENE EL IICA EN EL DESARROLLO DE METODOLOGIAS PARA LA EVALUACION DE LABORATORIOS, LAS CUALES ESTAN SIENDO APLICADAS EN MEXICO Y OTROS PAISES DE LATINOAMERICA, PARA CONOCER LA SITUACION ACTUAL DE SUS SERVICIOS DE LABORATORIO, A FIN DE DETECTAR LOS PUNTOS DEBILES PARA CORREGIRLOS; EN IGUAL FORMA, EL IICA, A TRAVES DE SUS ESPECIALISTAS, TIENE UNA GRAN EXPERIENCIA EN LA ORGANIZACION DE REDES NACIONALES DE LABORATORIOS CON UN MEDIO PARA POTENCIAR EL USO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CADA PAIS.

EL IICA EN MEXICO A TRAVES DEL PROGRAMA V, ACTUALMENTE ESTA EJECUTANDO LA COOPERACION TECNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIOS DE SALUD ANIMAL EN MEXICO", EL CUAL TIENE COMO CAMPO ESPECIFICO DE APOYO A LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO DE SALUD ANIMAL Y DE CONSTATAACION DE CALIDAD DE PRODUCTOS VETERINARIOS. ESTO HA PERMITIDO LLEVAR AL PAIS, A TRAVES DEL PROYECTO, HACIA LOS ULTIMOS ADELANTOS TECNOLOGICOS EN LA MATERIA, FACILITANDO EL INTERCAMBIO DE PROFESIONALES Y TECNICOS NACIONALES PARA CAPACITACION Y ACTUALIZACION.



IGUALMENTE EN MEXICO, EN LA ACTUALIDAD EL PROGRAMA V DEL IICA ESTA OTORGANDO COOPERACION TECNICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE CAPACITACION SOBRE CUARENTENA VEGETAL Y MOSCAS DE LA FRUTA, APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FITOSANITARIA Y COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA RESOLVER LA PROBLEMATICA DEL AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO.

EN ADICION A LOS INSTRUMENTOS DE COOPERACION TECNICA DE "PROYECTO" EL IICA EN MEXICO, EN APOYO A LA OPERACIONALIZACION DE LOS CITADOS PROYECTOS DE LA UTILIZACION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, HA CONVENIDO EL DESARROLLO DE DOS ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE LAS CUALES SE CONTRATAN SERVICIOS DE PERSONAL, ASESORIA, CONSULTORIA, MANTENIMIENTO, ADQUISICION DE EQUIPO, BECAS, ETC. ESTOS MECANISMOS DISPONIBLES, A TRAVES DE LOS RECURSOS DE CATI'S QUE LOS GENERAN, PERMITEN QUE CONJUNTAMENTE CON LOS RECURSOS DE CUOTAS ASIGNADOS AL PROYECTO NACIONAL IICA MEXICO DE SANIDAD VEGETAL, SE DISPONGA DE RECURSOS PARA OPERACIONALIZAR ESTA PROPUESTA DE PROYECTO NACIONAL IICA REFORMULADA.



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES Y METAS VERIFICABLES FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES

DEL IMPACTO ESPERADO

INDICADORES Y METAS DE IMPACTO DEL PROYECTO

INCREMENTADA LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE MEXICO PARA APOYAR MAS EFICIENTEMENTE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

EN EL AMBITO INSTITUCIONAL

- LA RED DE CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS DE MEXICO Y LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, SE REORGANIZAN, FORTALECEN Y MODERNIZAN, Y LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE MEXICO, ESTA EN MEJORES CONDICIONES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

EN EL AMBITO SECTORIAL.

- LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS CUENTA CON MAYOR CAPACIDAD PARA APOYAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION, NUTRICION, AUTOABASTECIMIENTO Y DE EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.
- EN EL SECTOR PRIVADO SE INCORPORA MAYORMENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FITOSANITARIAS, DANDOSE CUMPLIMIENTO A LA POLITICA SECTORIAL DE MAYOR PARTICIPACION DE PRODUCTORES, AGROINDUSTRIALES Y COMERCIANTES AGRICOLAS EN EL DESARROLLO; ADMINISTRACION, AUTOFINANCIAMIENTO Y PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS.

EN EL IICA

- SE DA FORTALEZA A LAS ACCIONES PROPUESTAS DENTRO DEL MARCO DEL PLANALC EN LO REFERENTE A:
 - MODERNIZACION FITOSANITARIA
 - APOYO COMERCIO INTERNACIONAL
 - PRIVATIZACION
 - OBTENCION DE FONDOS EXTERNOS
 - SE SIENTAN BASES PARA UN PROYECTO MULTINACIONAL.



OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO.

FORTALECER LOS SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE LOS CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS, LOS SERVICIOS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE MEXICO.

INDICADORES Y METAS DE TERMINACION DEL PROYECTO

A FINALES DE 1994 LA CAPACIDAD DE PREVENIR, CONTROLAR Y/O ERRADICAR PROBLEMAS FITOSANITARIOS SE HABRA INCREMENTADO COMPARATIVAMENTE CON 1990 Y SE CONTARA CON UNA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIOS INTEGRADA POR:

- UNA COORDINACION NACIONAL
- SUBCOORDINACION POR TIPO DE CENTRO
- CENTROS NACIONALES DE REFERENCIA
- CENTROS REGIONALES
- CENTROS DE EXCELENCIA

SE HAN FORTALECIDO TECNICA Y OPERATIVAMENTE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS PRIORITARIAS: AMARILLAMIENTO LETAL DEL COCOTERO, MOSCAS DE LA FRUTA, CARBON PARCIAL DEL TRIGO, LANGOSTA Y AFLATOXINAS.

PRODUCTOS FINALES QUE GENERAN EL PROYECTO

1. EL PERSONAL DE LOS CENTROS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS HAN SIDO CAPACITADOS Y SE MANTIENE ACTUALIZADA EN REGLAMENTACION FITOSANITARIA EN EVALUACION, INSPECCION, MUESTREO, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACION DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS.

INDICADORES Y METAS DEL LOGRO DE LOS PRODUCTOS FINALES.

- 1.1 DURANTE 1991, SE HABRAN REALIZADO ACCIONES PRIORITARIAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS.
- 1.2 DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1991, SE HABRA ELABORADO EL PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS.

FACTORES CONDICIONANTES PARA LA OBTENCION DEL IMPACTO ESPERADO

- LAS AUTORIDADES DE LA SARH MANTENDRAN LA DECISION POLITICA DE APOYAR LAS ACTIVIDADES EXPRESADAS EN EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SARH-IICA EN MATERIA DE COOPERACION FITOSANITARIA.
- LA SARH DESTINA RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CAPACITACION, FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNICA Y OPERATIVA, MODERNIZACION Y SISTEMAS DE INFORMACION.

FACTORES CONDICIONANTES PARA LOGRAR EL OBJETIVO ESPECIFICO.

- LA SARH APOYARA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION.
- LA SARH OTORGA EL APOYO Y APROBACION DE LA ELABORACION Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION.
- LA SARH DESTINA RECURSOS PARA LOS GASTOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION.



1.3 DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1991 SE HABRA DADO INICIO AL PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS Y CAMPARAS.

1.4 A FINALES DE 1994, SE HABRA CAPACITADO PERSONAL DE LOS 13 CENTROS Y CAMPARAS EN LAS AREAS DE:

- REGLAMENTACION FITOSANITARIA
- IDENTIFICACION
- EVALUACION DE IMPACTOS
- INSPECCION Y MUESTREO
- ANALISIS Y DIAGNOSTICO
- DESARROLLO TECNOLOGICO
- PRONOSTICO Y PREVENCIÓN
- CONTROL Y/O ERRADICACION
- ADMINISTRACION
- EVALUACION DE COSTOS
- EVALUACION DE BENEFICIOS
- SISTEMAS DE INFORMACION

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES METAS:

ANO	PERSONAL CAPACITADO
1991	300
1992	400
1993	550
1994	700

TOTAL	1 950

2. HA SIDO FORTALECIDA FISICA, TECNICA Y OPERATIVAMENTE LOS CENTROS, LOS SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y DE LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS.

2.1 A PRINCIPIOS DE 1991 SE HABRAN INICIADO LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO TECNICO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPARAS.

2.2 DURANTE 1991, SE HABRAN EVALUADO Y DIAGNOSTICADO LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, FISICO, TECNICO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y DE LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS.

- LA SARH APOYA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS Y LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS.

- LA SARH APOYA Y APRUEBA LA ELABORACION Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA SU FORTALECIMIENTO.

- A FINALES DE 1994, CADA CENTRO Y CAMPARA FITOSANITARIA CONTARAN CON LAS CONDICIONES APROPIADAS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

3. SE HAN ESTABLECIDO COMPROMISOS DE COORDINACION PARA LA COOPERACION Y FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

3.1 DURANTE 1991, SE HABRAN IDENTIFICADO NECESIDADES ADICIONALES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

3.2 A PARTIR DE 1991, SE HABRAN IDENTIFICADO POSIBLES FUENTES Y MECANISMOS PARA LOGRAR LA COORDINACION Y CONCERTACION DE ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA, Y DE AUTOFINANCIAMIENTO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

3.3 A PARTIR DE 1991, SE INICIARA LA ELABORACION DE NUEVAS PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA COOPERACION TECNICA, FINANCIERA Y DE AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

3.4 A FINALES DE 1994, SE TENDRAN EN OPERACION CENTROS BAJO LA ADMINISTRACION DEL SECTOR PRIVADO, CON EL APOYO DE NORMATIVIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL.

4. SE HA MEJORADO LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

4.1 A PARTIR DE 1991, SE INICIA UN ESTUDIO DE PUESTOS Y CARGOS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

- LA SARH DESTINA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MANUTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO Y CAMPO.

- LA SARH APOYA LA BUSQUEDA Y EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE COORDINACION Y DE CONCERTACION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, CON EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

- LA SARH MANTIENE UNA POLITICA DE MAYOR PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y PRIVATIZACION.


- A FINALES DE 1994, SE TENDRAN EN DESARROLLO, PROGRAMAS DE CENTROS Y CAMPAÑAS, BASADOS EN COMPROMISOS DE COOPERACION TECNICA, FINANCIERA Y DE AUTOFINANCIAMIENTO COORDINADOS Y CONCERTADOS CON SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

- LAS PRODUCTORAS, LA INDUSTRIA Y LA COMUNIDAD FITOSANITARIA COOPERAN TECNICA Y FINANCIERAMENTE EN APOYO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS DE IMPORTANCIA PRIORITARIA DEL PAIS.

- LA SARH APOYARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PUESTOS Y CARGOS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS Y CAMPAÑAS, PROCURANDO MOTIVACION Y ESTABILIDAD DEL PERSONAL.



- 4.2 A PARTIR DE 1991 SE INICIARAN GESTIONES TENDIENTES A BUSCAR LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS Y DE LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS
- 4.3 A FINALES DE 1994, LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS, CONTARAN CON UNA PLANTA DE PERSONAL DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE FAVORABLE DE INICIATIVA, MOTIVACION Y ESTIMULO, CON EL CONSECUENTE DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES BAJO SU RESPONSABILIDAD.
5. SE HAN DESARROLLADO Y MODERNIZADO TECNICAMENTE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPARAS FITOSANITARIAS.
- 5.1 A PRINCIPIOS DE 1991 SE TENDRA UN PERFIL DE PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y LAS CAMPARAS FITOSANITARIAS.
- 5.2 DURANTE 1991, SE DARA INICIO AL PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO Y MODERNIZACION TECNOLOGICA.
- 5.3 A FINALES DE 1994, SE HABRAN DESARROLLADO Y MODERNIZADO LAS TECNICAS Y METODOS PARA LA:
- REGLAMENTACION FITOSANITARIA
 - IDENTIFICACION
 - EVALUACION DE IMPACTOS
 - INSPECCION Y MUESTREO
 - ANALISIS Y DIAGNOSTICO
 - PRONOSTICO Y PREVENCION
 - CONTROL Y/O ERRADICACION
 - ADMINISTRACION
 - EVALUACION DE COSTOS
 - EVALUACION DE BENEFICIOS
 - SISTEMAS DE INFORMACION
- LA SARH PROMUEVE LA PRESENTACION Y APROBACION DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO, TENDIENTES A BUSCAR LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS DE CAMPARAS FITOSANITARIAS.
- LA SARH Y/O LOS PRODUCTORES-INDUSTRIALES DESTINAN RECURSOS PARA APOYO SALARIAL Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPARAS FITOSANITARIAS.
- LA SARH MANTIENE SU POLITICA DE MODERNIZACION DEL SECTOR.
- LA SARH DESTINA RECURSOS EN APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS Y LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACION.

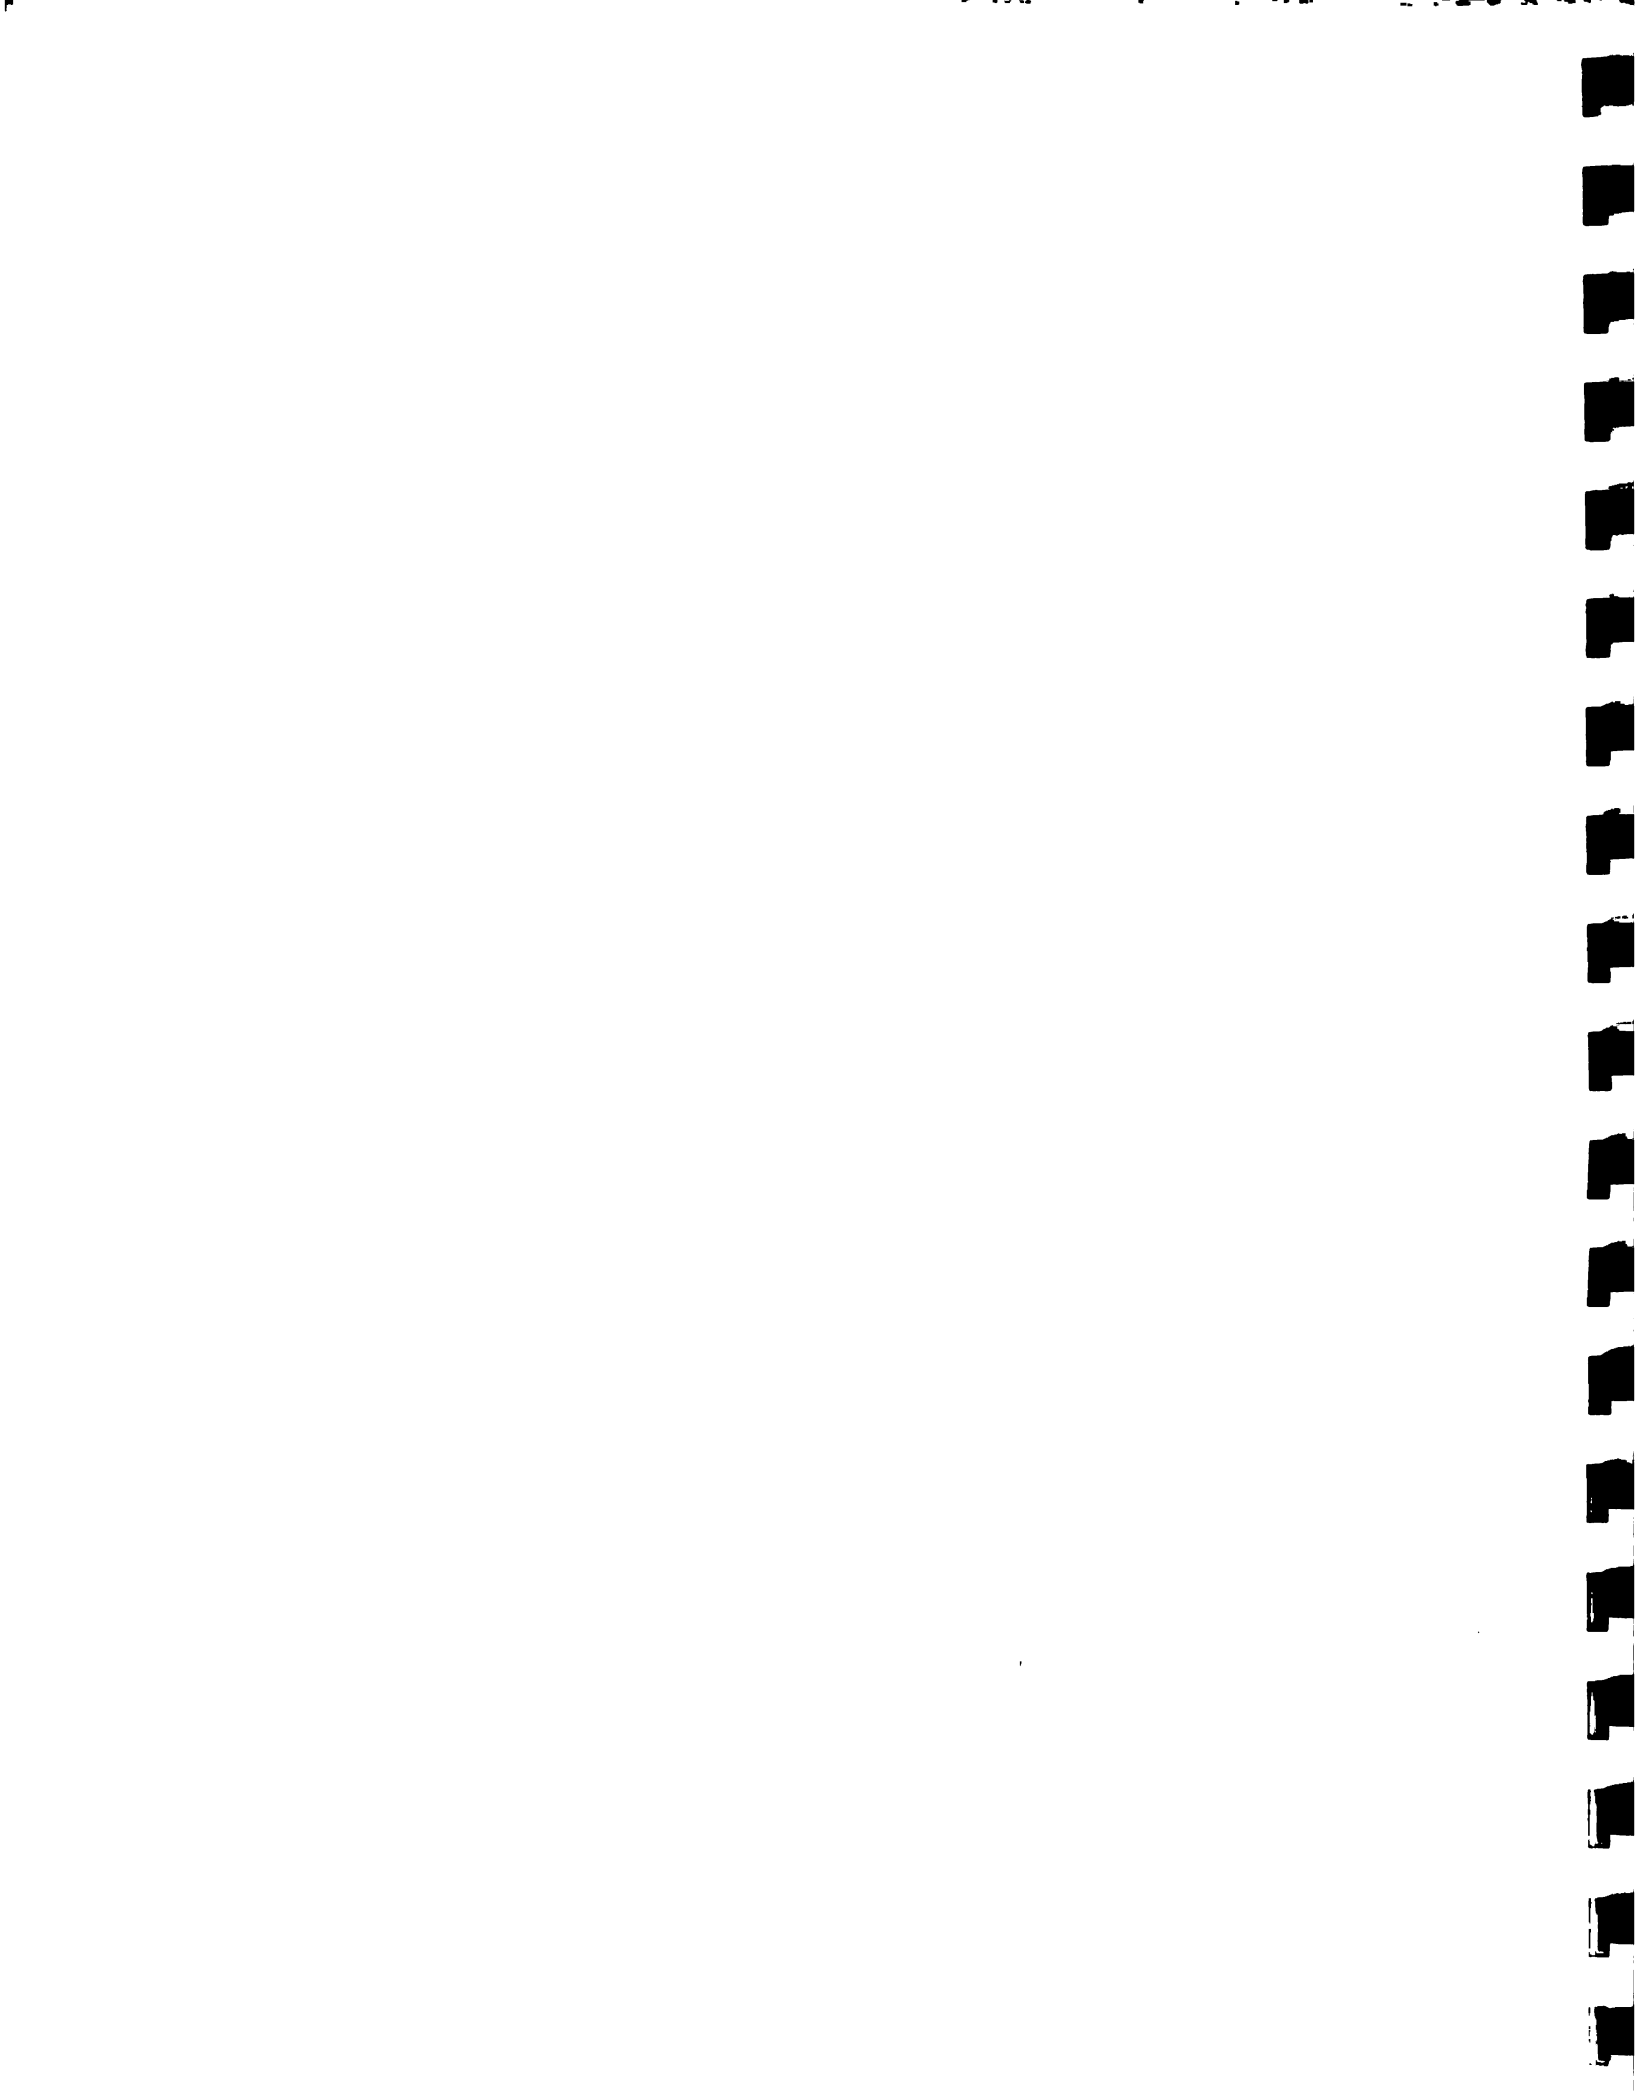

6.2 IMPACTOS.

6.2.1 A NIVEL DEL IICA.


EL PROGRAMA V DEL IICA, CUENTA Y CONTINUA DESARROLLANDO EXPERIENCIAS EN PROYECTOS SIMILARES, EN LOS CUALES EL OBJETIVO SE ORIENTA AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS LABORATORIOS FITO Y ZOOSANITARIOS. EL IICA, SE VERA BENEFICIADO AMPLIANDO Y PROFUNDIZANDO EN SU EXPERIENCIA DEL MANEJO DE ESTE TIPO DE PROYECTOS EN EL AREA DE SANIDAD VEGETAL.

EL PROYECTO SE UBICA DIRECTAMENTE DENTRO DEL AREA DE CONCENTRACION TEMATICA:

- "FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES PARA LA SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL", Y EN EL AREA DE "FOMENTO PARA LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL".
- POR OTRA PARTE, INDIRECTAMENTE ESTA ENMARCADO EN LAS AREAS TEMATICAS.
- "ASESORIA A LOS PAISES PARA SUPERAR LAS RESTRICCIONES QUE TRABAN EL COMERCIO INTERNACIONAL" Y EN EL AREA TEMATICA.

ESTA SITUACION PERMITE INDICAR QUE EL IICA-PROGRAMA V, GANARA EXPERIENCIA EN LAS AREAS DE APOYO FITOSANITARIO, AL COMERCIO INTERNACIONAL Y EN LA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO, LAS CUALES SON COMPONENTES FUNDAMENTALES DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA COOPERACION TECNICA EN EL MARCO DEL "PLAN DE REACTIVACION CONJUNTA PARA LA AGRICULTURA PLANALC".

A NIVEL HEMISFERICO, LAS ACCIONES DEL PROYECTO SE ENMARCAN DENTRO DEL PLANALC EN EL "PROGRAMA DE MODERNIZACION FITO Y ZOOSANITARIA, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y FACILITAR EL COMERCIO AGROPECUARIO" Y EL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Y LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES". A NIVEL SUBREGION, EN EL AREA CENTRAL SE ENMARCAN DENTRO DEL "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SANITARIO" Y EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION", Y A NIVEL SUBREGION



MEXICO, EL PROYECTO SE INSERTA DENTRO DEL, "PROGRAMA DE COOPERACION PARA SANIDAD VEGETAL", DENTRO DE UNA DE LAS POSIBLES AREAS DE CONCERTACION CONJUNTA ENTRE MEXICO Y ALC.

SE OBTENDRA UN IMPACTO PROBABLE DEL PROYECTO EN QUE MEDIANTE EL MISMO. MEDIANTE EL MISMO SE LOGRA ORIENTAR ADECUADAMENTE A LAS AUTORIDADES NACIONALES EN EL USO DE LOS RECURSOS QUE HA DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL CONTEXTO DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO. DE ESTA MANERA SE LOGRARIA SU PARTE DE LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO CUBIERTOS A TRAVES DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LAS ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, MANTENIENDO LOS GASTOS DE ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROYECTO CON CARGO A LOS RECURSOS DE CATI's GENERADOS POR DICHAS ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO.

EN TODO CASO SE ESPERA QUE EL PROYECTO SE CONSTITUYA EN UNA BASE FUNDAMENTAL DE EXPERIENCIA PARA EL IICA, PARA EL POSIBLE DESARROLLO FUTURO DE UN PROYECTO MULTINACIONAL EN EL AREA DE APOYO FITOSANITARIO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS REGIONALES FITOSANITARIAS PRIORITARIAS.

6.2.2 EN EL AMBITO INSTITUCIONAL.

LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, HABRA REORGANIZADO Y FORTALECIDO LA ESTRUCTURA NACIONAL Y REGIONAL DE LA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS Y DE LAS CAMPAÑAS PRIORITARIAS FITOSANITARIAS, HACIENDOLAS MAS OPERATIVAS Y ACORDES A NECESIDADES Y PRIORIDADES NACIONALES Y REGIONALES DE PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN APOYO A LA PRODUCCION Y EL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS, Y EN CONGRUENCIA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DISPONIBLES.

CON ELLO SE CUENTA CON UN MECANISMO MODERNO Y EFICIENTE QUE LE PERMITE DESARROLLAR Y DAR UN MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SITUACION CON LA CUAL SE DA ATENCION A LA POLITICA GUBERNAMENTAL DE MODERNIZACION Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO.



6.2.3 EN EL ESCENARIO SECTORIAL

ES DE ESPERARSE QUE COMO RESULTADO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, EL SECTOR AGRICOLA DEL PAIS TENGA MENOS LIMITANTES, PARA DISPONER DE MEDIOS Y METODOS QUE REUNAN LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA CONTROLAR LOS DIVERSOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS QUE AFECTAN A LA AGRICULTURA DE MEXICO.

ESTA SITUACION PERMITIRA UN MEJOR CONTROL DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS, APOYARA EL INCREMENTO EN LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD, Y PROPICIARA LA DISPONIBILIDAD DE VOLUMENES PARA EXPORTACION; TODO ELLO EN CONGRUENCIA CON LAS POLITICAS NACIONALES QUE EL GOBIERNO MEXICANO TIENE SEÑALADAS PARA EL SECTOR.

TAMBIEN EN EL AMBITO SECTORIAL, EL PROYECTO SE CONSTITUYE EN UN MECANISMO QUE PERMITE PONER EN PRACTICA Y DESARROLLO DE LA POLITICA NACIONAL DE INCREMENTAR LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO, SE PROPICIA EL AUTOFINANCIAMIENTO, E INCLUSIVE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS.

7. ESTRATEGIA

7.1 LAS ACCIONES.

LA ESTRATEGIA BASICA PARA LA OPERACIONALIZACION DE ESTE PROYECTO ES LA DE LOGRAR APROVECHAR AL MAXIMO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS OPERATIVOS EN BENEFICIO DEL COMPONENTE TECNICO DEL MISMO, MANTENIENDO CLARAMENTE DIFERENCIADOS LOS PROPOSITOS BASICOS DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS.

LA ESTRATEGIA QUE SE SEGUIRA PARA ALCANZAR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS FINALES DEL PROYECTO SERA LA SIGUIENTE:

- a. EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SE CAPACITARA Y SE MANTENDRA ACTUALIZADO EN TECNICAS DE EVALUACION INSPECCION,



MUESTREO, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS.

CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CENTROS FITOSANITARIOS, SE PROMOVERÁ LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS Y DE LAS CAMPAÑAS DE IMPORTANCIA PRIORITARIA NACIONAL.

CON BASE EN EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y DE ACUERDO AL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y DE FINANCIAMIENTO CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SE APOYARÁ LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES INMEDIATAS DE CAPACITACIÓN PARA CUBRIR NECESIDADES INMEDIATAS Y ADICIONALMENTE, UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

EL APOYO DEL PROYECTO AL LOGRO DE ESTE PRODUCTO ESTA ENCAMINADO PRINCIPALMENTE A LA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO, ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ESTADO LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS A CARGO DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL MEDIANTE "ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO CONCERTADAS CON EL IICA" .

LA COPARTICIPACIÓN DEL IICA-PROGRAMA V EN ESTAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS HEMISFÉRICOS RIMISA, CUARENTENA Y EMERGENCIA, Y APOYO A LAS EXPORTACIONES, SERÁ DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL PARA LOGRAR ESTE PRODUCTO.

- b. SE FORTALECERÁ LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LOS CENTROS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

A LA FECHA CONJUNTAMENTE CON DIRECTIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE LOS SETENTA Y UN CENTROS REGIONALES EXISTEN A NIVEL NACIONAL SE HAN SELECCIONADO SEIS COMO CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA CRRF LOS CUALES QUEDARÁN BAJO LA DIRECCIÓN DIRECTA DE LA SARH/SANIDAD VEGETAL. EN



CUANTO A LOS RESTANTES TENDRA QUE DEFINIRSE SU DESTINO. PARA AMBAS SITUACIONES SE PROCEDERA A REALIZAR UN DIAGNOSTICO ACTUALIZADO QUE PERMITA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CRRF Y LAS ALTERNATIVAS PARA LOS CENTROS RESTANTES, TOMANDO SIEMPRE EN CONSIDERACION LAS OPCIONES EXISTENTES DE COORDINACION Y CONCERTACION TECNICA Y FINANCIERA.


EN CUANTO A LAS CAMPANAS FITOSANITARIAS CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL SE ESTA DESARROLLANDO UN PROCESO DE DIAGNOSTICO DE NECESIDADES, CON BASE EN EL CUAL SE ELABORARA UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ELLAS.

LA COOPERACION DEL PROYECTO PARA EL LOGRO DE ESTE PRODUCTO CONSISTE EN EL APOYO TECNICO PARA LA REALIZACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LA ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO, LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE MATERUALES Y EQUIPO DE LABORATORIO Y CAMPO, SON APORTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL A TRAVES DE "ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIDAS CON EL IICA EN MEXICO"

- c. SE ESTABLECERA COMPROMISOS DE COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA COOPERACION Y FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CAMPANAS FITOSANITARIAS CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNOSTICOS DE LOS CENTROS Y CAMPANAS Y DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES PARA EL MANEJO DE CENTROS REGIONALES Y CAMPANAS SE APOYARA LA ELABORACION DE UN PROGRAMA DE COORDINACION Y CONCERTACION TECNICA Y DE FINANCIAMIENTO, EL CUAL PERMITA:

- UNA MEJOR EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS A LA SANIDAD VEGETAL.
- UNA MAYOR PARTICIPACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACION EN ACTIVIDADES DE IMPORTANCIA PRIORITARIA NACIONAL.
- PROPICIAR LA PARTICIPACION DE SOCIEDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS RELACIONADAS CON LA FITOSANIDAD EN APOYO



DE LA SOLUCION DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS DE IMPORTANCIA NACIONAL.

- INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES EN LAS ACCIONES DE ELABORACION, DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.
- PROMOVER LA ADMINISTRACION, AUTOFINANCIAMIENTO Y PRIVATIZACION DE SERVICIOS FITOSANITARIOS CON LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.
- INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE AGROINDUSTRIALES Y EXPORTADORES EN APOYO DE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS.

LA COOPERACION DEL PROYECTO ESTA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LOS DIAGNOSTICOS, PROGRAMAS DE NECESIDADES, ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS DE CONCERTACION Y COORDINACION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CONVENIDAS.

- d. SE MEJORARAN LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE HABRAN DE ASIGNARSE A LOS CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA Y A LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, SE APOYARA LA ELABORACION DE UN ANALISIS DE PUESTOS Y CARGAS DE TRABAJO TENDIENTES A ESTABLECER NIVELES SALARIALES Y PRESTACIONES ACORDES CON LAS FUNCIONES QUE DEBERA DESARROLLAR EL PERSONAL DE LOS CENTROS Y CAMPAÑAS.

ADICIONALMENTE SE APOYARA LA DETERMINACION Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA DE COOPERACION TECNICA Y DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA A LOS CENTROS Y CAMPAÑAS, CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO CON CONDICIONES SALARIALES Y PRESTACIONES LABORALES QUE ESTIMULEN UN DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES Y SU PERMANENCIA DENTRO DE LA INSTITUCION.

- e. SE DESARROLLARAN Y MODERNIZARAN TECNICAMENTE LOS CENTROS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.

LA MODERNIZACION EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL EN MEXICO SE VISUALIZA COMO EL PROCESO DE ACTUALIZACION Y UTILIZACION DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS MAS ACORDES CON LAS NECESIDADES DE ATENCION FITOSANITARIA Y LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA EN MATERIA DE PRONOS



TICO Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS EXÓTICOS; INSPECCIÓN Y TRATAMIENTOS CUARENTENARIOS; MUESTREO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS; ANÁLISIS, REGISTRO Y CONTROL DE PLAGUICIDAS; Y DE SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN FITOSANITARIA DE APOYO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FITOSANITARIAS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, Y DE TOMA DE DECISIONES EN ATENCIÓN A PROBLEMAS DE CARÁCTER EMERGENTE.

LA COOPERACIÓN DEL PROYECTO PARA EL LOGRO DE ESTE PRODUCTO, ESTA ORIENTADA A PROPORCIONAR ASESORIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE PROCEDIMIENTOS MÁS RECOMENDABLES PARA PROPICIAR LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL. EL PROYECTO CONTEMPLA RECURSOS DE APOYO A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE MODERNIZACIÓN MUY ESPECÍFICAS Y ESPECIALIZADAS.


LOS RECURSOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS, PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTO ESTÁN CONTEMPLADOS EN "ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO" CONCERTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL CON EL IICA EN MÉXICO.

7.2 ETAPAS DEL PROYECTO.

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN TRES ETAPAS LAS CUALES SEGURO RAMENTE SE TRASLADARÁN DEBIDO AL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES POR PARTE DE GOBIERNO FEDERAL Y AL NIVEL DE RESPUESTA DE ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y/O FINANCIERA, COORDINADAS Y/O CONCERTADAS CON LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. EN ESTAS ETAPAS SE IDENTIFICAN LOS ÁMBITOS GEOGRÁFICOS E INSTITUCIONAL, LOS ASPECTOS TEMÁTICOS CONTEMPLADOS Y LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y MÉTODOS.

a. DIAGNÓSTICO

INCLUYE LOS DIAGNÓSTICOS DE LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES, INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y APOYOS TÉCNICOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS DE LOS 71 CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS Y DE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DE PRIORIDAD Y EMERGENCIA NACIONAL. SE DARÁ ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS



CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA DE MATAMOROS, TORREON, MEXICALI, CULIACAN, GUADALAJARA Y TAPACHULA. EN CUANTO A CAMPANAS, MOSCAS DE LA FRUTA, AMARILAMIENTO LETAL DEL COCOTERO, AFLATOXINAS, ROEDORES, CARBON PARCIAL DEL TRIGO, SIGATOKA NEGRA, SOYA LINEAL DE LA CEBADA, LANGOSTA, PLAGAS DEL SUELO Y PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN MAIZ Y FRIJOL PRINCIPALMENTE.

SE ESTIMA QUE ESTA ETAPA DURARA DE SEIS A NUEVE MESES, NO OBSTANTE EN ESTE PERIODO HABRAN DE INICIARSE ALGUNAS ACCIONES QUE REQUIEREN ATENCION INMEDIATA PRIORITARIA, COMO APOYO FITOSANITARIO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS, EN LO REFERENTE A MECANISMOS DE INSPECCION, MUESTREO Y TRATAMIENTO CUARENTENARIO, SISTEMAS COMPUTARIZADOS SOBRE REQUISITOS AL COMERCIO INTERNACIONAL Y REGISTRO Y CONTROL DE PLAGUICIDAS.

PARA EL DIAGNOSTICO DE LOS CENTROS Y CAMPANAS SE UTILIZARA LA METODOLOGIA DESARROLLADA POR EL PROGRAMA Y PARA EVALUAR LOS LABORATORIOS DE SALUD ANIMAL Y LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS DE LOS PAISES DE AMERICA LATINA.

b. FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNICA Y OPERATIVA.

COMPRENDE LA ELABORACION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO SOBRE CAPACITACION, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OPERATIVA DE LOS CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA Y CAMPANAS FITOSANITARIAS PRIORITARIAS.

INCLUYE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACION Y CONCERTACION PARA LA COOPERACION TECNICA Y DE FINANCIAMIENTO CON LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL TENDIENTE A LOGRAR SU APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y CAMPANAS.

LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SON PRIORITARIOS DE APOYO A PRODUCCION Y PROTECCION DE CULTIVOS DE MAIZ Y FRIJOL Y A PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS DE EXPORTACION, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE LOS COMITES FITOSANITARIOS DE PRODUCTORES, AUTOFINANCIAMIENTO Y PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS.



- c. CONSOLIDACION DE: SISTEMA NACIONAL DE ANALISIS DE RIESGOS Y PREVENCION DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS, LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA, EL SISTEMA CUARENTENARIO DE APOYO AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FITOSANITARIA Y LOS COMITES ESTATALES DE SANIDAD VEGETAL INTEGRADOS POR LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

7.3 FINANCIAMIENTO.

LA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO TIENE UN CARACTER MUY ESPECIAL DEBIDO A QUE SE TIENE PREVISTO LA UTILIZACION DE RECURSOS DE VARIOS DE FUENTES DIVERSAS, RECURSOS REGULARES DE CUOTAS Y FINANCIAMIENTO A TRAVES DE RECURSOS DE CATI's DERIVADOS DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO PROVENIENTES DE LA OPERACIONALIZACION DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO IICA/SARH EN MATERIA DE COOPERACION FITOSANITARIA.

LA COOPERACION TECNICA CONTEMPLADA EN EL PROYECTO SE REALIZA CON CARGO A LOS RECURSOS DE CUOTAS Y A LOS CATI's GENERADOS POR LAS ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO, LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNICA Y OPERATIVA ASI COMO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACCIONES DE CAPACITACION SE REALIZA EN EL MARCO COMPLEMENTARIO DE LAS ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO DENOMINADAS "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS MEXICANOS".

LAS ACCIONES DEL PROYECTO PODRAN FORTALECERSE A TRAVES DE UNA CAPITALIZACION ADECUADA DEL INTERES Y RECURSOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE INDUSTRIALES Y PRODUCTORES, PARA PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON EL IICA EN ACCIONES DE APOYO A LA PRODUCCION Y AL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

ESPECIAL ATENCION SE OTORGARA A LA INTERACCION DEL PROYECTO CON LOS PROYECTOS HEMISFERICOS DEL PROGRAMA V CON LA FINALIDAD DE COORDINAR Y COMPLEMENTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE LOS PROYECTOS.

.



8. ACTIVIDADES BASICAS

TITULO DE LAS ACTIVIDADES BASICAS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD.	PREREQUISITOS INSTITUCIONALES
1 CAPACITACION	<p>1.1 SE DETERMINARAN LAS NECESIDADES DE CAPACITACION.</p> <p>1.2 SE ELABORARA Y DESARROLLARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN LAS AREAS DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REGLAMENTACION FITOSANITARIA - IDENTIFICACION DE PROBLEMAS - EVALUACION DE IMPACTOS - INSPECCION DE MUESTREO - ANALISIS Y DIAGNOSTICO - DESARROLLO TECNOLOGICO - PRONOSTICO Y PREVENCION - CONTROL Y ERRADICACION - ADMINISTRACION DE CENTROS Y SERVICIOS DE CAMPANAS - EVALUACION DE COSTOS - EVALUACION DE BENEFICIOS - SISTEMAS DE INFORMACION 	<ul style="list-style-type: none"> - LA SARH APOYA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION. - LA SARH PROMUEVE Y APOYA LA REALIZACION DE ACCIONES DE CAPACITACION. - LA SARH AUTORIZA Y APOYA LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, CAMPANAS Y DE LOS SERVICIOS DE REGLAMENTACION FITOSANITARIA PARA EVENTOS DE CAPACITACION. - LA SARH DESTINA RECURSOS FINANCIEROS A LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION.
2. APOYOS OPERATIVOS	<p>2.1 SE REALIZARAN EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS DE CENTROS, CAMPANAS Y SERVICIOS DE REGLAMENTACION FITOSANITARIA.</p> <p>2.2 SE REALIZARA UN ANALISIS Y DETERMINACION DE NECESIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNICA Y OPERATIVA DE CADA CENTRO, CAMPANA Y DE SERVICIOS DE REGLAMENTACION FITOSANITARIA DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDA DESARROLLAR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LA SARH APOYA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE LOS CENTROS Y CAMPANAS FITOSANITARIAS. - LA SARH MANTIENE Y ESTIMULA SU POLITICA DE COORDINACION Y CONCERTACION CON EL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, PRIORITARIAMENTE CON LOS PRODUCTORES AGRICOLAS.



- 2.3 DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS SE ESTABLECERA UN PROGRAMA DE ATENCION A CUATRO AÑOS (CUATRO FASES), AL CABO DE LO CUAL, SE HABRA REALIZADO EL FORTALECIMIENTO TOTAL DE LA RED. EL FORTALECIMIENTO DE CAMPAÑAS PRIORITARIAS Y DE LOS SERVICIOS REGLAMENTARIOS FITOSANITARIOS (CUARENTENAS Y PLAGUICIDAS)
 - 2.4 SE IDENTIFICARAN AREAS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO.
 - 2.5 SE IDENTIFICARAN POSIBLES FUENTES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO.
 - 2.6 SE PROMOVERA LA COORDINACION Y CONCERTACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO.
 - 2.7 SE PROMOVERA EL AUTOFINANCIAMIENTO DE LOS CENTROS SERVICIOS Y CAMPAÑAS FITOSANITARIAS.
 - 2.8 SE PROMOVERA LA PRIVATIZACION DE CENTROS REGIONALES FITOSANITARIOS.
 - 2.9 SE REALIZARA UN ANALISIS DE PUESTOS Y CARGOS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, CAMPAÑAS Y SERVICIOS FITOSANITARIOS.
 - 2.10 SE REALIZARA UN ANALISIS DE NECESIDADES Y CARGAS DE TRABAJO DE CADA CENTRO, CAMPAÑA Y SERVICIO FITOSANITARIO.
 - 2.11 SE ELABORARAN PROPUESTAS DE ADECUACION SALARIAL Y DE ACCIONES DE MOTIVACION Y ESTIMULOS.
 - 2.12 SE BUSCARA LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL
- LA SARH APOYA ACCIONES ADECUACION SALARIAL Y DE CONFORMACION Y CONSOLIDACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS.
 - LA SARH DESTINA RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA Y OPERATIVA DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS.



3. APOYOS TECNICOS

3.1 SE DISENARA Y ESTABLECERA UN PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO Y MODERNIZACION DE TECNICAS Y METODOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CAMPARAS Y REGLAMEN-TACION FITOSANITARIA.

- LA SARH MANTIENE SU POLITICA DE MODERNIZACION.
- LA SARH APOYA A LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL EN EL DESARROLLO DE TECNICAS Y LA MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS.
- LA SARH DESTINA RECURSOS PARA LA MODERNIZACION FITOSANITARIA.

9. RESPONSABILIDADES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES
ACTIVIDADES BASICAS

	DGSV	IICA*	OTRAS**
1. CAPACITACION	A.P.I.R	A.P.I.R.	P.
2. APOYOS OPERATIVOS	A.P.I.R	A.P.I	P.
3. APOYOS TECNICOS	A.P.I.R	A.P.I.R	P.

A = AFRUEBA.


P = PARTICIPA.

I = INFORMA.

R = RESPONSABLE

* LA RESONSABILIDAD DEL IICA ES DE CARACTER DE ASESORIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, LOS GASTOS DE SU REALIZACION SON RESPONSABILIDAD DEL IICA, PERO CON CARGO A LOS RECURSOS QUE LA DIRECCION GENERAL TRANSFIRIO AL IICA, PARA SU MANEJO A TRAVES DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO

** INIFAP, COLEGIO DE POSTGRADUADOS, UNAM, GIFAP, AMIPFAC, FAO, WHO, OPS, OIRSA, USDA, FDA, EPA, PRODUCTORES EXPORTADORES GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, ETC. LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS PARTICIPANTES ESTA CONDICIONADA A LOS TERMINOS DE COORDINACION Y CONCERTACION QUE SE CONVENGAN.



10. BENEFICIARIOS

LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SON DIVERSOS, Y EL TIPO DE BENEFICIO QUE OBTIENE CADA GRUPO DE ELLOS, TAMBIEN ES DE INDOLE DIFERENTE, A CONTINUACION SE INDICAN LOS GRUPOS BENEFICIADOS Y EL TIPO DE BENEFICIO QUE SE ESPERA TENDRA CADA UNO DE ELLOS:

10.1 A NIVEL GENERAL. EL FAIS, AL CONTAR CON UN APOYO TECNICO FITOSANITARIO MAS ADECUADO LE PERMITE:

- MEJOR CONTROL DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS
- MENOS PERDIDAS
- MEJORES INGRESOS

10.2 COMERCIANTE


- DISPONEN DE MAYORES VOLUMENES DE PRODUCTOS PARA COMERCIALIZAR.
- EXPERIMENTAR MENOR NUMERO DE RESTRICCIONES COMERCIALES PRINCIPALMENTE EN LOS MERCADOS DE COMERCIO INTERNACIONAL.
- MAYORES INGRESOS.

10.3 INDUSTRIALES.

- DISPONEN DE MAYORES VOLUMENES PARA INDUSTRIALIZACION.
- SE PROMUEVE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN SUS PRODUCTOS.
- DISMINUYEN LOS RECLAMOS POR FALTAS DE CALIDAD.
- MAYORES INGRESOS.

10.4 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL.

- DESARROLLA MAS EFICIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES Y GANA CONFIANZA, CREDIBILIDAD Y APOYO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES Y COMERCIANTE DE PRODUCTOS AGRICOLAS.
- DISMINUYE LA PRESION POLITICA DEBIDA A LA REAL O APARENTE FALTA DE SUPERVICION OFICIAL PARA CONTROLAR LOS DIFERENTES PROBLEMAS FITOSANITARIOS.




- INCREMENTA SU CAPACIDAD DE COORDINACION Y CONCERTACION NACIONAL E INTERNACIONAL CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.
- EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA RED Y DE LAS CAMPANAS POR LA CAPACITACION Y LA MEJORA EN LAS CONDICIONES TECNICO LABORALES.
- TECNICOS DEL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL POR LA EXPERIENCIA DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

10.5 M E X I C O.

- INCREMENTA SU PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA.
- DISMINUYE LA IMPORTACION AGRICOLA Y PAGO DE DIVISAS.
- TIENDE A LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA.
- GANA CREDIBILIDAD, CONFIANZA Y PRESTIGIO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION.
- INCREMENTA SUS EXPORTACIONES AGRICOLAS Y EL INGRESO DE DIVISAS.
- REFUERZA PRESTIGIO INTERNACIONAL EN EL AMBITO ECOLOGISTA AL CONTAR CON PROGRAMA DE CONTROL DE LOS PLAGUICIDAS.
- MEJORA SU ECONOMIA.

10.6 EL PUBLICO EN GENERAL.

- DISPONE DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE MEJOR CALIDAD.
- SE DISMINUYEN LOS RIESGOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS CON RESIDUOS INACEPTABLES DE PLAGUICIDAS.
- DISMINUYE LA TENSION EMOCIONAL DERIVADA DE POSIBLES RIESGOS DE INGESTION DE PRODUCTOS CONTAMINADOS POR PLAGUICIDAS.
- TIENDE A GANAR MAYOR CONCIENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SANIDAD VEGETAL.



11. COSTOS TOTALES

ARO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(3-9)	T O T A L
PRIMER AÑO 1991											
REGULARES		25.0		4.0				1.0	0.5	5.5	30.5
CATI's			5.0	7.0	4.5	11.0	4.0	11.50	3.0	46.0	46.0
SEGUNDO AÑO 1991											
REGULARES		26.4		5.0	1.0			1.0	0.5	7.5	33.9
CATI's			6.0	8.0	5.0	11.5	4.0	11.5	4.5	50.0	50.0
TERCER AÑO 1993											
REGULARES		28.7		5.5	1.0			1.5	0.5	8.5	37.2
CATI's			6.5	9.0	5.5	11.5	4.5	12.0	5.0	54.0	54.0
CUARTO AÑO 1994											
REGULARES		35.5		6.0	1.0			1.5	0.5	9.0	44.5
CATI's			7.0	10.0	5.5	12.0	5.0	12.5	6.0	58.0	58.0
SUBTOTALES:											
REGULARES		115.6		20.5	3.0			5.0	2.0	30.5	146.1
CATI's			24.5	34.0	20.5	46.0	17.5	47.5	18.5	208.0	208.0
TOTAL:		115.6	24.5	54.5	23.5	46.0	17.5	52.5	20.5	238.5	354.1

1 PERSONAL INTERNACIONAL IICA

2 COSTOS PERSONAL PROFESIONAL NACIONAL Y DE SERVICIOS GENERALES

3 BECAS

4 VIAJES MIEMBROS DEL IICA

5 DOCUMENTOS Y MATERIALES DE OFICINA

6 ADQUISICION O ALQUILER PLANTA/EQUIPO

7 MANTENIMIENTO COMUNICACIONES SERVICIOS GENERALES

8 CONTRATOS POR RESULTADOS, OBRAS, DONACIONES, SUBSIDIOS

9 OTROS GASTOS



12. C R O N O G R A M A .

ACTIVI- DADES	AÑO 1				AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.CAPACI- TACION.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.APOYOS OPERA- TIVOS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.APOYOS TECNI- COS.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



PARTE C: BASES PARA LA PUESTA EN MARCHA, SEGUIMIENTO,
EVALUACION Y AJUSTES DEL PROYECTO.

13. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO.

ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE
- CONCERTAR LA PROPUESTA CON LAS AUTORIDADES DE SANIDAD VEGETAL	DIC/90.	REPRESENTANTE Y ESPECIALISTA EN SANIDAD VEGETAL DE LA OFICINA DEL IICA EN MEXICO.
- CONTAR CON LA OPINION DE LA OFICINA DEL IICA EN MEXICO.	DIC/90.	REPRESENTANTE DEL IICA EN MEXICO.
- CONTAR CON LA OPINION DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA V.	DIC/90.	DIRECTOR DE PROGRAMA V. ✓
- CONTAR CON LA OPINION DE LA DIRECCION DE OPERACION DEL AREA CENTRAL.	DIC/90.	DIRECTOR DE AREA CENTRAL.
- APROBACION DEL PROYECTO POR LA SEDE CENTRAL.	DIC/90.	SEDE CENTRAL DIPROE.
- APROBACION DE ACCION DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA 1991.	DIC/90.	REPRESENTANTE IICA/MEXICO Y DIRECTOR DE SANIDAD VEGETAL.
- ADECUACION SALARIAL DEL ESPECIALISTA EN SANIDAD VEGETAL EN MEXICO.	DIC/90.	OFICINA IICA MEXICO.




14 INDICADORES E INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

14.1 MEDIOS DE VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS


INDICADORES Y METAS	MEDIOS DE VERIFICACION	RESPONSABLE
1.1 DURANTE 1991, SE HABRAN REALIZADO ACCIONES PRIORITARIAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS.	DOCUMENTO DE INFORME ANUAL 1991. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	D6SV/IICA
1.2 PARA FINALES DEL PRIMER SEMESTRE 1991, SE HABRA ELABORADO EL PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS.	DOCUMENTO DE INFORME ANUAL 1991 DOCUMENTO PROGRAMA	D6SV/IICA
1.3 DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE, A PRINCIPIOS DE 1991, SE HABRA DADO INICIO AL PROGRAMA DE CAPACITACION PERMANENTE PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS.	INFORMES DE EVENTOS DE CAPACITACION INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	D6SV/IICA
1.4 A FINALES DE 1994, SE HABRA CAPACITADO A PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS EN LAS AREAS DE:	INFORME FINAL DEL PROYECTO 1994.	D6SV/IICA
- REGLAMENTACION FITOSANITARIA - IDENTIFICACION - EVALUACION DE IMPACTOS - INSPECCION Y MUESTREO - ANALISIS Y DIAGNOSTICO - DESARROLLO TECNOLOGICO - PRONOSTICO Y PREVENCION - CONTROL Y ERRADICACION - ADMINISTRACION - EVALUACION DE COSTOS - EVALUACION DE BENEFICIOS - SISTEMAS DE INFORMACION	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	

DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES METAS:

ARO PERSONAL CAPACITADO	
1991	300
1992	400
1993	550
1994	700
-----	-----
TOTAL	1 950



<p>2.1 A PARTIR DE ENERO DE 1991, SE INICIARAN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PRIORITARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNICA Y OPERATIVA DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS.</p>	<p>DOCUMENTOS DE INFORME ANUAL 1991.</p>	<p>D6SV/IICA</p>
<p>2.2 A FINALES DE 1991, SE HABRAN EVALUADO Y DIAGNOSTICADO LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, FISICO, TECNICO Y OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNICA Y OPERATIVA DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS.</p>	<p>INFORMES DE VISITAS A LOS CENTROS INFORME ANUAL 1991 INFORMES Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION.</p>	<p>D6SV/IICA</p>
<p>2.3 A FINALES DE 1994, CADA CENTRO, SERVICIO REGLAMENTARIO Y CAMPARA FITOSANITARIA CUENTA LAS CONDICIONES FISICAS, QUE LE PERMITEN DESARROLLAR ADECUADAMENTE SUS ACTIVIDADES.</p>	<p>INFORMES DE INVENTARIO DE RECURSOS.</p>	<p>D6SV/IICA</p>
<p>3.1 DURANTE 1991, SE HABRAN IDENTIFICADO NECESIDADES ADICIONALES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIO REGLAMENTARIO Y DE CAMPANAS FITOSANITARIAS.</p>	<p>INFORME ANUAL 1991. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION</p>	<p>D6SV/IICA</p>
<p>3.2 A PARTIR DE 1991, SE HABRAN IDENTIFICADO POSIBLES FUENTES Y MECANISMOS PARA LOGRAR LA COORDINACION Y CONCERTACION DE ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA, Y DE AUTOFINANCIAMIENTO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS FITOSANITARIAS.</p>	<p>INFORME ANUAL 1991 INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION</p>	<p>D6SV/IICA</p>
<p>3.3 A PARTIR DE 1991, SE INICIARA LA ELABORACION DE NUEVAS PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE COORDINACION Y CONCERTACION DE ACCIONES DE COOPERACION TECNICA FINANCIERA Y DE AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS FITOSANITARIAS.</p>	<p>INFORME ANUAL 1992. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.</p>	<p>D6SV/IICA</p>



- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>3.4 A FINALES DE 1994, SE TENDRAN EN DESARROLLO, PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS BASADOS EN COMPROMISOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA, COORDINADOS Y CONCERTADOS CON EL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.</p> | <p>INFORME FINAL DE PROYECTO 1994.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |
| <p>3.5 A FINALES DE 1994, SE TENDRAN EN OPERACION, CENTROS BAJO LA ADMINISTRACION DEL SECTOR PRIVADO, CON EL APOYO DE LA NORMATIVIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL.</p> | <p>INFORME FINAL DE PROYECTO 1994.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |
| <p>4.1 A PARTIR DE 1991 SE INICIA UN ESTUDIO DE PUESTOS Y CARGOS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS FITOSANITARIAS.</p> | <p>INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

INFORME ANUAL 1991.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |
| <p>4.2 DURANTE 1991 SE INICIARAN GESTIONES TENDIENTES A BUSCAR LA ESTABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y DE LAS CAMPANAS FITOSANITARIAS.</p> | <p>INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION</p> | |
| <p>4.3 A FINALES DE 1994, LOS CENTROS, LOS SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y LAS CAMPANAS FITOSANITARIAS CONTARAN CON UNA PLANTA DE PERSONAL DESARROLLANDO SUS ACTIVIDADES EN UN AMBIENTE FAVORABLE DE: INICIATIVA, MOTIVACION Y ESTIMULOS, CON EL CONSECUENTE DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES BAJO SU RESPONSABILIDAD.</p> | <p>INFORME FINAL PROYECTO 1994.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |
| <p>5.1 A PRINCIPIOS DE 1991, SE TENDRA UN PERFIL DE UN PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO Y MODERNIZACION DE LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y CAMPANAS</p> | <p>DOCUMENTO DE INFORME ANUAL 1991.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |
| <p>5.2 DURANTE 1991, SE DARA INICIO AL PROGRAMA PERMANENTE DE DESARROLLO Y MODERNIZACION TECNOLOGICA.</p> | <p>DOCUMENTO DE INFORME ANUAL 1991.

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION.</p> | <p>D6SV/IICA</p> |



5.3 A FINALES DE 1994, SE HABRAN DESARROLADO Y MODERNIZADO LAS TECNICAS Y METODOS PARA:

INFORME FINAL 1994.

D6SV/IICA


- REGLAMENTACION FITOSANITARIA
- IDENTIFICACION
- EVALUACION DE IMPACTOS
- INSPECCION Y MUESTREO
- ANALISIS Y DIAGNOSTICO
- DESARROLLO TECNOLÓGICO
- PRONOSTICO Y PREVENCIÓN
- CONTROL Y ERRADICACION
- ADMINISTRACION.
- EVALUACION DE COSTOS
- EVALUACION DE BENEFICIOS
- SISTEMAS DE INFORMACION

INFORMES DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACION

14.2 SITUACION ESPERADA A LA CONCLUSION DEL PROYECTO.

AL TERMINO DEL PROYECTO EN 1994, LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL DE MEXICO, TENDRA EN OPERACION UNA RED NACIONAL DE CENTROS REGIONALES DE REFERENCIA FITOSANITARIA, LOS SISTEMAS REGLAMENTARIOS DE CUARENTENAS Y PLAGUICIDAS LO CUAL CONTARA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ACORDE CON LAS PRIORIDADES AGRICOLAS NACIONALES. IGUALMENTE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS DESARROLLARAN SUS ACTIVIDADES EN UN MARCO ORGANIZACIONAL MAS ADECUADO, QUE PERMITA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS DIVERSOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARTICULARMENTE EL PROVENIENTE DE LOS PRODUCTORES Y EL SECTOR PRIVADO.

LOS CENTROS, SERVICIOS REGLAMENTARIOS Y LAS CAMPAÑAS CONTARAN CON EL APOYO DE INSTALACIONES, LABORATORIOS, EQUIPO Y PERSONAL, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA MODERNA, LO CUAL PERMITIRA DESARROLLAR ADECUADAMENTE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, MUESTREO, ANALISIS, Y DIAGNOSTICO, EN APOYO AL CONTROL Y/O ERRADICACION DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS PRIORITARIOS.



PARTICULARMENTE EN CUANTO A PERSONAL, SE ESPERA CONTAR CON UNA PLANTILLA DE PERSONAL CAPACITADO, LA CUAL DESARROLLARA SUS ACTIVIDADES, EN UN AMBIENTE DE ESTABILIDAD, MOTIVACION Y ESTIMULO PROFESIONAL, SITUACION QUE PERMITIRA ASEGURAR EFICACIA Y EFICIENCIA CONTINUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS CENTROS Y LAS CAMPAÑAS.

ESTAS CONDICIONES, PERMITIRAN DISMINUIR EL IMPACTO DE LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS, EVITANDOSE O DISMINUYENDOSE ASI, PERDIDAS EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS DEBIDAS A PLAGAS Y ENFERMEDADES CONTRIBUYENDOSE CON ELLO A MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD Y COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL AGRICOLA, CON EL CONSECUENTE MEJORAMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES.

COMO RESULTADO DE ELLO TAMBIEN, UNA TENDENCIA DE REDUCCION EN EL NUMERO DE RECHAZOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS MEXICANOS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE EXPORTACION, DEBIDOS A LA PRESENCIA DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS INDESEABLES Y/O A NIVELES DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS INACEPTABLES.

ADICIONALMENTE, Y COMO RESULTADO DE ESTAS ACCIONES, SE HABRA MANIFESTADO UNA TENDENCIA DE DISMINUCION EN EL NUMERO DE RECLAMACIONES POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, ANTE LAS AUTORIDADES DE SANIDAD VEGETAL, DEBIDAS A REALES O APARENTES FALLAS EN LA ATENCION CONTRA LOS PROBLEMAS FITOSANITARIOS Y CON UNA MEJORIA EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS.

UNA CONDICION MUY IMPORTANTE QUE SE ESPERA AL FINAL DEL PROYECTO, LA CUAL DEFINITIVAMENTE SERVIRA DE BASE FUNDAMENTAL PARA EL MEJOR DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED, LOS CENTROS Y LAS CAMPAÑAS, ES QUE SE CONTARA CON UN SISTEMA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS RESULTANTES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL OBJETO DE REALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS Y PROPICIAR EL INCREMENTO DE RECURSOS ADICIONALES EN APOYO A LA ACTIVIDAD.



COMO ESTRATEGIA DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO Y MODERNIZACION DE LA RED Y LAS CAMPANAS, SE ESPERA TENER EN OPERACION CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA CON EL SECTOR PUBLICO Y SOCIAL, EN LAS AREAS DE ENSEANZA, INVESTIGACION Y SERVICIO.


COMO ESTRATEGIA DE APOYO FINANCIERO Y COMO MEDIDA PARA CONCIENTIZAR A LOS USUARIOS DE LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS, SE ESPERA QUE AL FINAL DEL PROYECTO, SE TENGA EN OPERACION UN PROGRAMA DE COBRO POR LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS CON TENDENCIA A LOGRAR EL AUTOFINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

EN RESPUESTA A LA POLITICA NACIONAL DE MAYOR PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR, AL FINAL DEL PROYECTO SE ESPERA TENER EN OPERACION CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIAMIENTO, CON PRODUCTORES, INDUSTRIALES Y COMERCIANTES, EXPORTADORES PRINCIPALMENTE.

ESFUERZOS SIGNIFICATIVOS HABRAN SIDO REALIZADOS CON EL OBJETO DE QUE AL FINAL DEL PROYECTO, ALGUNOS DE LOS CENTROS ESTEN SIENDO ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR EL SECTOR PRIVADO DE PRODUCTORES, BAJO LA NORMATIVIDAD Y APOYO TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL.

UNA CONDICION MUY INTERESANTE QUE SE ESPERA OBTENER AL FINAL DEL PROYECTO ES HABER ESTABLECIDO MECANISMOS PERMANENTES DE INCORPORACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO NACIONAL CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTEN REALIZANDO POR PARTE DEL IICA EN EL AMBITO DE DE PROYECTOS HEMISFERICOS Y PROYECTOS MULTINACIONALES EN EL AREA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y SU INTERRELACION CON PROYECTOS DE OTROS PROGRAMAS DEL IICA PARTICULARMENTE EN DE COMERCIALIZACION Y AGROINDUSTRIA.

15. PREPARACION Y PRESENTACION DE VERSIONES REVISADAS DEL DOCUMENTO PROYECTO.

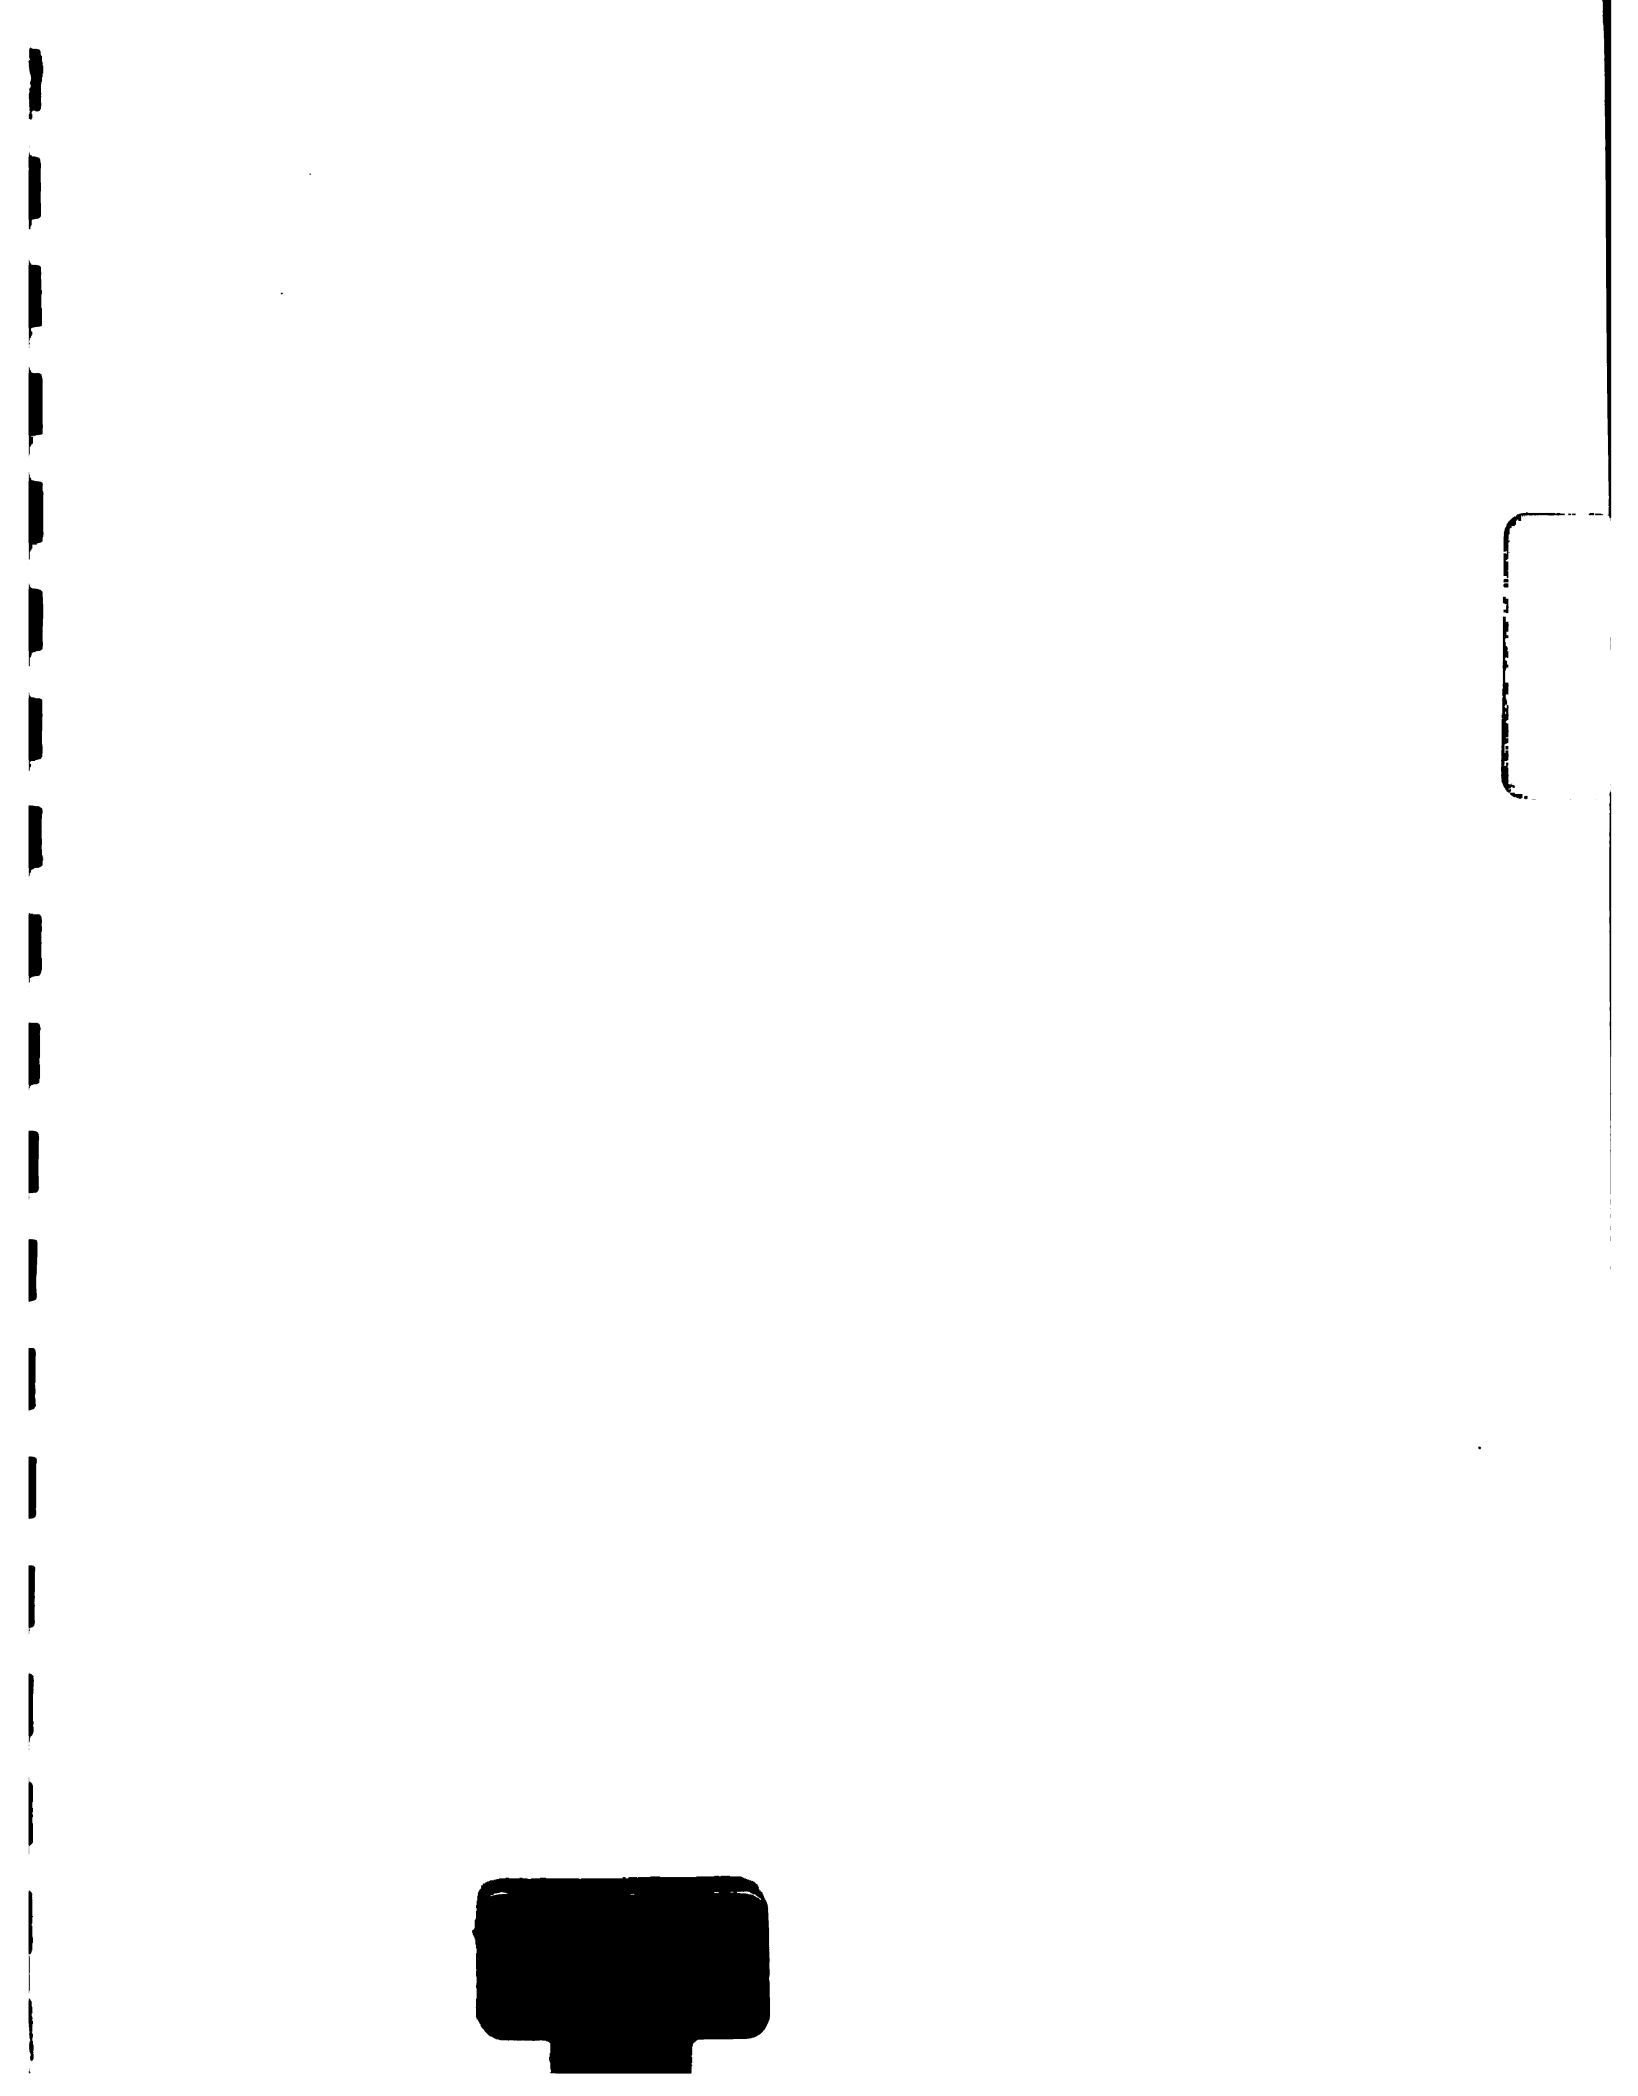

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

Insurgentes Sur No. 933-4o. Piso Col. Nápoles 03810 México, D.F.

Apartado Postal 61-148 06600 México, D.F. Tels. 543-15-42 y 523-88-17 FAX 536-10-00
